



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR  
INTRODUCCIÓN**

A continuación se presentará el estudio del sector económico y de los oferentes por parte de la entidad conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar el proceso de contratación y la consecuente aceptación de la oferta.

De acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente versión G-EES-02, las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada.

**Objeto: «OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN EL JARILLÓN QUE COMPRENDE LOS TRAMOS CRÍTICOS ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA COITA Y PUNTA CARTAGENA, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.»**

El objeto del contrato se encuentra codificado en la clasificación UNSPSC hasta el cuarto nivel (4) de la siguiente manera:

Segmentos	Familia	Clase	Nombre
72	14	12	Servicios de construcción marina
72	14	15	Servicios de preparación de tierras
72	15	39	Servicios de preparación de obras de construcción

## **1. ANALISIS DEL MERCADO**

### **Identificación del sector económico al cual pertenece la necesidad**

La actividad económica sobre la cual recae el presente proceso se encuentra enmarcada dentro del sector secundario de la economía, dentro de este sector se encuentra el subsector de la construcción, el cual podría definirse como la actividad que permite la hechura de viviendas, edificios, espacios públicos, centros comerciales, escuelas, carreteras, autopistas, puentes y demás infraestructuras para satisfacer las necesidades de la población que crece constantemente. Esta actividad está compuesta tanto por las obras públicas como privadas de un país.

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al SECTOR CONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. A partir de la resolución 66 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C.

**SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN** Teniendo en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. (2020) - DANE, esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal.

Dándole mayor especificación a la actividad que hace parte al objeto de estudio, se encuentra en esta sección la construcción completa de obras de ingeniería civil (división 42 «Obras de ingeniería civil») y las actividades especializadas de construcción, si se realizan solo como parte del proceso de construcción (división 43 «Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil»). Las cuales se describe a continuación:

**DIVISIÓN 42 Obras de ingeniería civil.**

Esta división comprende obras generales de construcción para proyectos de ingeniería civil.

Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter provisional.

Se incluyen obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, puertos y otros proyectos relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de una retribución o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad.

**Grupo 429 Clase 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil;** Esta clase incluye:

- La construcción, la conservación y la reparación de:
  - ✓ Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre otros.
  - ✓ Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques.
- El dragado de vías de navegación.
- Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento al aire libre.
- La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura de suministro público, etcétera).

**DIVISIÓN 43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.**

Esta división comprende actividades especializadas de construcción (obras especiales), es decir, la construcción de partes de edificios y de obras de ingeniería civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran en un aspecto común a diferentes estructuras, que requiere la utilización de técnicas o equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentación, el levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalación de andamios, la construcción de techos, etc. También se incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean fabricados por la propia unidad constructora. Las actividades de construcción especializadas suelen realizarse en régimen de subcontratación, en particular en el caso de los trabajos de reparación que se realizan directamente para el dueño de la propiedad.

**Grupo 431 Clase 4312 Preparación del terreno.**

Esta clase comprende la preparación del terreno para posteriores actividades de construcción.

Esta clase incluye:

- La limpieza de terrenos de construcción.



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

- El movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, etcétera.
- Las perforaciones de prueba, sondeos de exploración y recogida de muestras de sondeo para actividades de construcción y para fines geofísicos, geológicos o similares.
- La preparación de terrenos para actividades de explotación de minas y canteras: remoción del estéril y actividades de otro tipo para preparar y aprovechar terrenos y propiedades mineras, excepto yacimientos de petróleo y gas.
- El drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o forestales.

***Grupo 439 Clase 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.***

Esta clase incluye:

- Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados:
  - ✓ Cimentación, incluida la hincadura de pilotes.
  - ✓ Obras de aislamiento contra el agua y la humedad.
  - ✓ Deshumidificación de edificios.
  - ✓ Profundización de pozos.
  - ✓ Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora.
  - ✓ Curvado de acero.
  - ✓ Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra.
  - ✓ Construcción de techos para edificios residenciales.
  - ✓ Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo.
  - ✓ Construcción de chimeneas y hornos industriales.
  - ✓ Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas.
- Las obras subterráneas.
- La construcción de piscinas.
- La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios.
- El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores.
- La erección o la instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia.


**ASPECTO ECONÓMICO**

En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que la actividad que satisface la necesidad pertenece a las actividades de construcción, a continuación, se presenta su participación en la economía nacional tomando como fuente de información el Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2020pr publicado por el DANE el 15 de febrero de 2021, Boletín de Indicadores Económicos del banco de la república (24 de Mayo 2021), Boletín Técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) corte Marzo 08 2021.

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR  
**Producto Interno Bruto (PIB)**  
IV trimestre 2020 preliminar

**Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB)**  
Tasas de crecimiento en volumen<sup>1</sup>  
2014-I-2020<sup>pr</sup>-IV

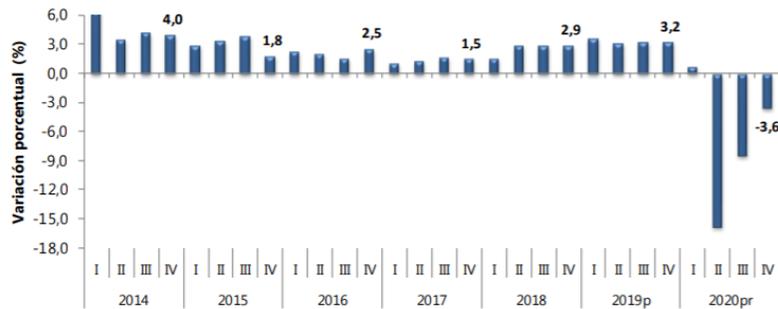

Fuente: DANE, Cuentas nacionales  
<sup>1</sup>Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
<sup>p</sup>preliminar  
<sup>pr</sup>provisional

Como se puede observar en la gráfica anterior, es notable como la economía colombiana en términos de su producto interno bruto ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años; se podría considerar una tendencia decreciente debido a las contingencias y choques socioeconómicos que han sufrido los mercados.

El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020 respecto al año 2019; las actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual).

En el cuarto trimestre de 2020<sup>pr</sup>, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 3,6% respecto al mismo periodo de 2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,6% (contribuye -1,3 puntos porcentuales a la variación anual).
- Explotación de minas y canteras decrece 19,3% (contribuye -1,1 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 6,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 17,8%.

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 7,7%.
- Industrias manufactureras crece 7,3%.

<b>Tabla 1. Valor agregado por actividad económica</b>			
<b>Tasas de crecimiento en volumen<sup>1</sup></b>			
<b>2020<sup>Pr</sup>- Año total</b>			
<b>Actividad económica</b>	<b>Tasas de crecimiento</b>		
	<b>Serie original</b>		<b>Serie corregida de efecto estacional y calendario</b>
	<b>Año total</b>	<b>Anual</b>	<b>Trimestral</b>
	<b>2020<sup>Pr</sup> / 2019<sup>Pr</sup></b>	<b>2020<sup>Pr</sup> - IV / 2019<sup>Pr</sup> - IV</b>	<b>2020<sup>Pr</sup> - IV / 2020<sup>Pr</sup> - III</b>
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,8	3,4	1,3
Explotación de minas y canteras	-15,7	-19,3	-1,6
Industrias manufactureras	-7,7	-0,2	7,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado <sup>2</sup>	-2,6	-0,9	3,4
Construcción	-27,7	-27,7	-0,2
Comercio al por mayor y al por menor <sup>3</sup>	-15,1	-6,6	17,8
Información y comunicaciones	-2,7	-3,9	-1,0
Actividades financieras y de seguros	2,1	2,9	0,0
Actividades inmobiliarias	1,9	1,8	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas <sup>4</sup>	-4,1	-2,5	3,2
Administración pública, defensa, educación y salud <sup>5</sup>	1,0	3,3	4,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios <sup>6</sup>	-11,7	-7,3	7,7
<b>Valor agregado bruto</b>	<b>-6,9</b>	<b>-3,7</b>	<b>6,1</b>
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	-6,1	-3,0	6,1
<b>Producto Interno Bruto</b>	<b>-6,8</b>	<b>-3,6</b>	<b>6,0</b>

**Fuente:** DANE, Cuentas nacionales

<sup>Pr</sup> preliminar

<sup>1</sup>Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

<sup>2</sup>Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

<sup>3</sup>Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.

<sup>4</sup>Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

<sup>5</sup>Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

<sup>6</sup>Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

De acuerdo a la información suministrada por el banco de la república en su Boletín de Indicadores Económicos del banco de la república (24 de Mayo 2021), se puede apreciar que para el primer trimestre del año 2021, presenta una leve mejoría en sus indicadores económicos generales en comparación con los 4 trimestres del año 2020 (ver cuadro 1)



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

Cuadro 1. Producto interno bruto (PIB)

(precios constantes Año Base 2015)

Series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario

Periodo	PIB		Consumo final		Formación bruta de capital		Exportaciones		Importaciones (-)	
	Miles de millones de pesos	Variación anual %	Miles de millones de pesos	Variación anual %	Miles de millones de pesos	Variación anual %	Miles de millones de pesos	Variación anual %	Miles de millones de pesos	Variación anual %
<b>Información anual</b>										
2005	514.853		419.077		86.720		88.125		78.708	
2006	549.435	6,7	444.943	6,2	101.405	16,9	96.513	9,5	92.625	17,7
2007	586.457	6,7	472.591	6,2	117.424	15,8	102.516	6,2	105.461	13,9
2008	605.713	3,3	492.507	4,2	128.090	9,1	104.604	2,0	118.656	12,5
2009	612.616	1,1	503.416	2,2	120.026	-6,3	99.158	-5,2	108.395	-8,6
2010	640.151	4,5	529.002	5,1	131.503	9,6	101.203	2,1	120.134	10,8
2011	684.628	6,9	558.993	5,7	155.852	18,5	113.608	12,3	144.436	20,2
2012	711.415	3,9	589.694	5,5	160.351	2,9	118.690	4,5	157.977	9,4
2013	747.939	5,1	621.266	5,4	172.869	7,8	124.241	4,7	171.443	8,5
2014	781.589	4,5	648.134	4,3	193.533	12,0	123.882	-0,3	184.747	7,8
2015	804.692	3,0	670.201	3,4	191.305	-1,2	125.936	1,7	182.750	-1,1
2016	821.489	2,1	681.101	1,6	190.994	-0,2	125.673	-0,2	176.279	-3,5
2017	832.656	1,4	696.973	2,3	184.828	-3,2	128.902	2,6	178.075	1,0
2018 (p)	854.008	2,6	724.648	4,0	187.608	1,5	129.730	0,6	188.413	5,8
2019 (pr)	882.029	3,3	755.028	4,2	194.743	3,8	133.714	3,1	202.250	7,3
2020 (pr)	822.088	-6,8	725.740	-3,9	155.169	-20,3	109.228	-18,3	167.264	-17,3
<b>Información trimestral*</b>										
2018-I (p)	211.065	2,2	178.636	3,6	46.002	-2,9	31.771	-1,8	45.542	0,8
2018-II (p)	212.431	2,2	181.032	4,2	46.743	1,0	32.120	-1,1	47.259	5,6
2018-III (p)	214.554	2,8	182.052	4,0	46.997	3,4	32.062	-1,1	46.771	6,6
2018-IV (p)	215.958	3,0	182.928	4,1	47.866	4,7	33.777	6,7	48.841	10,4
2019-I (pr)	217.380	3,0	185.292	3,7	48.965	6,4	33.690	6,0	49.400	8,5
2019-II (pr)	219.836	3,5	188.144	3,9	48.145	3,0	33.758	5,1	51.186	8,3
2019-III (pr)	221.416	3,2	190.044	4,4	49.468	5,3	33.480	4,4	51.268	9,6
2019-IV (pr)	223.398	3,4	191.548	4,7	48.165	0,6	32.786	-2,9	50.396	3,2
2020-I (pr)	217.418	0,0	192.328	3,8	45.492	-7,1	32.489	-3,6	49.704	0,6
2020-II (pr)	185.664	-15,5	166.331	-11,6	29.993	-37,7	24.951	-26,1	35.425	-30,8
2020-III (pr)	203.305	-8,2	175.974	-7,4	41.601	-15,9	25.675	-23,3	39.085	-23,8
2020-IV (pr)	215.701	-3,4	191.107	-0,2	38.083	-20,9	26.113	-20,4	43.049	-14,6
2021-I (pr)	221.867	2,0	194.671	1,2	45.948	1,0	29.595	-8,9	47.275	-4,9

Fuente: cuentas nacionales, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

p: Provisional pr: Preliminar

\* Se refiere a la variación de cada trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior.

<https://www.banrep.gov.co/es/pib>

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales>

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales>

Información Anual


Información Trimestral

Sin embargo de acuerdo al Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), emitida por el DANE en Marzo 2021, nos informa que Para el mes de marzo de 2021, la tasa de desempleo fue 14,2%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020 (12,6%). La tasa global de participación se ubicó en 60,3% y la tasa de ocupación en 51,7%. Para el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 59,2% y 51,7%, respectivamente

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**


**Gráfico 2. Tasa global de participación, ocupación y desempleo  
Total nacional  
Marzo (2012– 2021)**

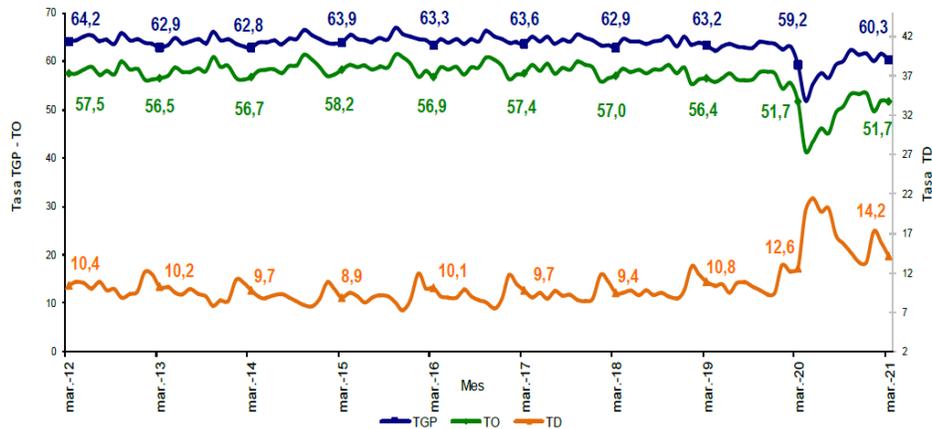

Fuente: DANE, GEIH.

A nivel nacional se encontró que la tasa de desempleo del trimestre enero - marzo 2021 fue 15,8%, presentando un aumento de 3,2 puntos porcentuales frente al trimestre enero - marzo 2020 (12,6%). La tasa global de participación fue 60,7%, lo que significó una disminución de 0,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2020 (61,6%). Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 51,1%, lo que representó una disminución de 2,7 puntos porcentuales comparado con el trimestre enero – marzo de 2020 (53,8%).

**Gráfico 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo  
Total nacional  
Enero - marzo (2012 - 2021)**

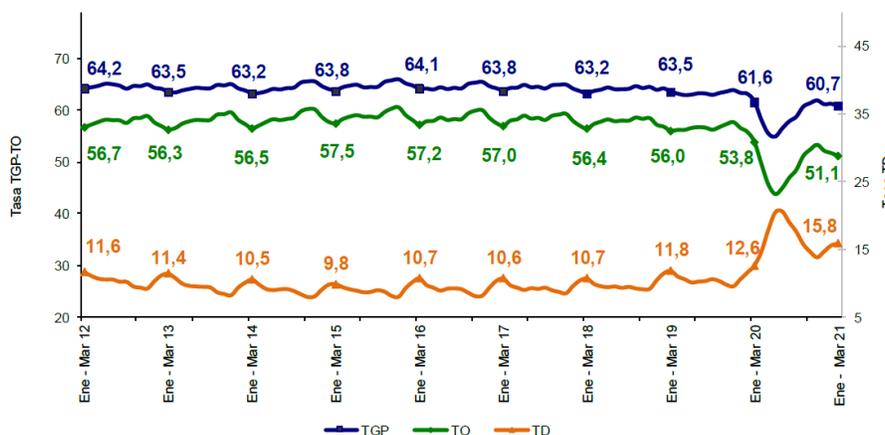

Fuente: DANE, GEIH.



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

Según las ramas de actividad en el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 20.529 miles de personas. Las ramas que más restaron a la variación de la población ocupada fueron Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios y Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana con 1,0 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente. Entre tanto, la rama de Construcción y Comercio y reparación de vehículos contribuyó positivamente a la variación de la ocupación con 0.2 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente.

**Tabla 1. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad<sup>^</sup>**

**Total nacional**

**Enero - marzo (2021/2020)**

Rama de actividad	Total Nacional				
	Ene - Mar 21	Ene - Mar 20	Distribución %	Variación absoluta	Contribución en p.p.
<b>Población ocupada</b>	20.529	21.360	100	-832	
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	1.750	1.961	8,5	-212	<b>-1,0</b>
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.121	2.313	10,3	-192	<b>-0,9</b>
Alojamiento y servicios de comida	1.616	1.729	7,9	-112	<b>-0,5</b>
Industrias manufactureras	2.228	2.339	10,9	-111	<b>-0,5</b>
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.283	1.381	6,3	-97	<b>-0,5</b>
Transporte y almacenamiento	1.520	1.593	7,4	-74	<b>-0,3</b>
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.235	3.300	15,8	-65	<b>-0,3</b>
Actividades inmobiliarias	240	267	1,2	-27	<b>-0,1</b>
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos	240	257	1,2	-17	<b>-0,1</b>
Actividades financieras y de seguros	293	310	1,4	-17	<b>-0,1</b>
Información y comunicaciones	312	323	1,5	-11	<b>-0,1</b>
Explotación de minas y Canteras	167	178	0,8	-10	<b>0,0</b>
Construcción	1.492	1.445	7,3	47	<b>0,2</b>
Comercio y reparación de vehículos	4.032	3.956	19,6	76	<b>0,4</b>

**Fuente:** DANE, GEIH.

<sup>^</sup>Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la información del anexo estadístico.

p.p: Puntos porcentuales.

**Nota:** La distribución porcentual de la población ocupada puede diferir del 100% por la no inclusión de la categoría "No informa".

**Nota:** Poblaciones en miles.

En el período de referencia, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron:

- 1. Riohacha:** Tasa de desempleo 23,2%; tasa global de participación 58,2%; tasa de ocupación 44,7% y tasa de subempleo objetivo 19,0%.
- 2. Cúcuta AM:** Tasa de desempleo 22,5%; tasa global de participación 60,7%; tasa de ocupación 47,0% y tasa de subempleo objetivo 14,8%.
- 3. Quibdó:** Tasa de desempleo 21,9%; tasa global de participación 49,4%; tasa de ocupación 38,6% y tasa de subempleo objetivo 3,0%.

Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron:

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

1. **Cartagena:** Tasa de desempleo 11,5%; tasa global de participación 56,6%; tasa de ocupación 50,1% y tasa de subempleo objetivo 8,3%.
2. **Barranquilla AM:** Tasa de desempleo 11,6%; tasa global de participación 60,7%; tasa de ocupación 53,6% y tasa de subempleo objetivo 15,3%.
3. **Bucaramanga AM:** Tasa de desempleo 15,0%; tasa global de participación 63,8%; tasa de ocupación 54,3% y tasa de subempleo objetivo 11,1%.

**Tabla 10. Tasa global de participación, ocupación, desempleo y subempleo  
23 ciudades y áreas metropolitanas  
Trimestre enero - marzo 2021**

Enero - marzo 2021							
Dominio	TGP	TO	TS (subj)	TS (obj)	TD (2021)	TD (2020)	Variación TD
Riohacha	58,2	44,7	31,5	19,0	23,2	17,6	+
Cúcuta AM	60,7	47,0	30,3	14,8	22,5	19,8	+
Quibdó	49,4	38,6	13,4	3,0	21,9	22,5	-
Ibagué	55,7	43,6	16,4	6,9	21,7	19,4	+
Neiva	57,6	45,7	16,1	9,0	20,6	17,9	+
Valledupar	58,6	46,6	28,7	11,9	20,4	19,0	+
Bogotá DC	67,0	53,6	23,8	11,1	20,1	11,8	+
Tunja	58,0	46,5	14,4	7,0	19,8	15,9	+
Villavicencio	62,7	50,7	19,1	8,7	19,1	15,6	+
Popayán	56,1	45,5	11,5	6,7	18,9	17,0	+
Manizales AM	57,6	46,7	15,2	5,9	18,9	14,9	+
Calí AM	67,6	54,9	29,1	14,8	18,7	14,0	+
Armenia	59,6	48,6	21,4	10,7	18,6	19,0	-
<b>*Total 23 ciudades y AM</b>	<b>63,5</b>	<b>52,0</b>	<b>23,6</b>	<b>11,2</b>	<b>18,2</b>	<b>13,0</b>	<b>+</b>
<b>Total 13 ciudades y AM</b>	<b>64,2</b>	<b>52,6</b>	<b>23,9</b>	<b>11,3</b>	<b>18,1</b>	<b>12,6</b>	<b>+</b>
Medellín AM	63,8	52,4	22,0	9,8	17,9	12,9	+
Montería	57,1	47,4	18,0	9,4	17,1	12,4	+
Florencia	60,0	49,9	15,2	8,7	16,8	18,1	-
Santa Marta	57,7	48,7	22,9	11,2	15,6	13,4	+
Pereira AM	58,3	49,3	10,3	5,8	15,5	12,3	+
Sincelejo	61,0	51,6	25,9	12,1	15,4	14,6	+
Pasto	66,6	56,5	31,0	12,5	15,1	14,2	+
Bucaramanga AM	63,8	54,3	19,4	11,1	15,0	11,8	+
Barranquilla AM	60,7	53,6	28,7	15,3	11,6	9,1	+
Cartagena	56,6	50,1	24,4	8,3	11,5	9,9	+

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.  
(+): Aumento o disminución de la TD del trimestre de cada ciudad frente al mismo periodo del año anterior.  
\*El total de las 23 ciudades no incluye San Andrés por tener una distribución de la muestra diferente.


OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Boletín Técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) Corte marzo 08 de 202, en su aparte del Empleo, nos informa que En el trimestre móvil noviembre 2020 – enero 2021, el número de ocupados en el total nacional fue 20.896 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,3% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil noviembre 2020 – enero 2021, la población ocupada en el total nacional disminuyó 6,7%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 4,0%.

Para el trimestre móvil noviembre 2020 – enero 2021, 1.524 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 85,4% estaban ubicados en las cabeceras (1.302 miles de personas) y el 14,5% (222 miles de personas) en centros poblados y rural disperso.

**Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2017 - 2020<sup>Pr</sup> (nov 20 – ene 21)**

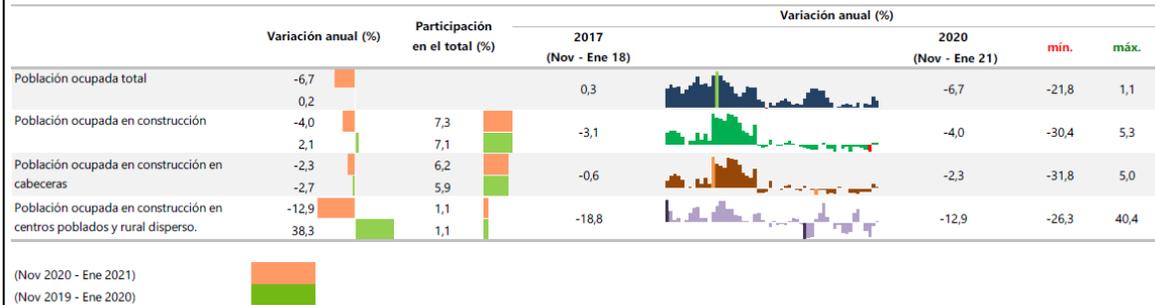

Fuente: DANE, GEIH.

Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

Observando el PIB desde el enfoque de la producción el boletín técnico de DANE nos informa que la:

**Construcción**

Para el año 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 27,7%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 27,2%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 28,9%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 27,3%.

En el cuarto trimestre de 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 27,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 26,5%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 29,6%.

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 27,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,2%, explicado por:

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,4%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 3,8%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,7%.

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2020 <sup>Pr</sup> / 2019 <sup>P</sup>	2020 <sup>Pr</sup> - IV / 2019 <sup>P</sup> -IV	2020 <sup>Pr</sup> - IV / 2020 <sup>Pr</sup> - III
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-27,2	-26,5	4,4
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril <sup>2</sup>	-28,9	-29,6	-3,8
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil <sup>3</sup>	-27,3	-27,5	1,7
<b>Construcción</b>	<b>-27,7</b>	<b>-27,7</b>	<b>-0,2</b>

**Tabla 6. Construcción**  
**Tasas de crecimiento en volumen<sup>1</sup>**  
**2020<sup>Pr</sup>– Año total**

**DANE**  
INFORMACIÓN PARA TODOS

**Boletín Técnico**  
Producto Interno Bruto (PIB)  
IV trimestre 2020<sup>Pr</sup>


**Fuente:** DANE, Cuentas nacionales

<sup>Pr</sup>preliminar  
<sup>P</sup>provisional  
<sup>1</sup>Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.  
<sup>2</sup>Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.  
<sup>3</sup>Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) Octubre 2020 – febrero 2021 con corte a marzo 08 de 2021pr, nos indican que al comparar el comportamiento del sector de la construcción entre los IV trimestre del año 2019 y 2020, se observa unas disminuciones significativas, donde uno de los indicadores que más sobresale es el de producción de obras que pasa de 12,5 en el IV trimestre del 2019 a -26-1 en el IV trimestre del 2020.

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

**Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción  
IV Trimestre (2019 – 2020<sup>Pr</sup>)**

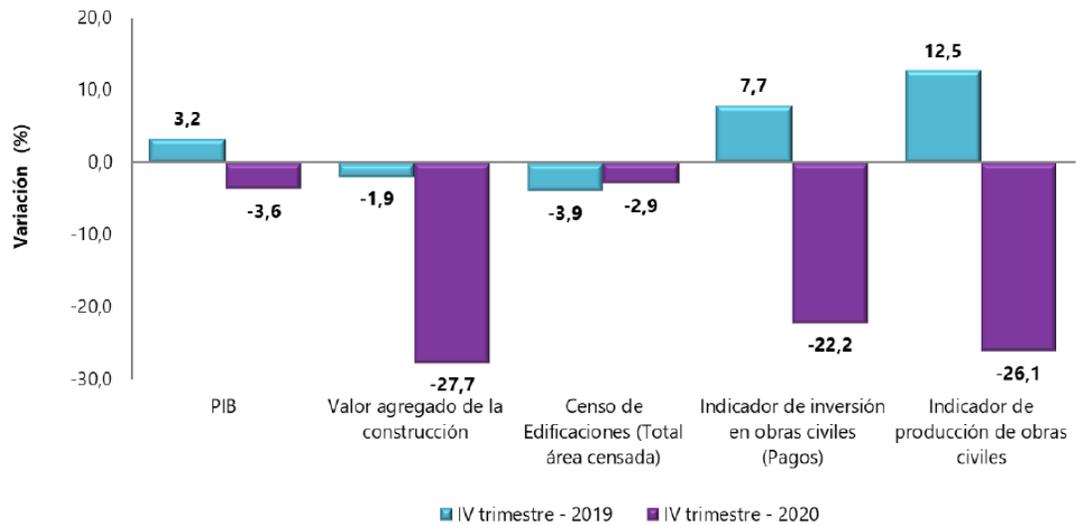

**Fuente:** DANE, IEAC.


Pr: cifras provisionales

En el cuarto trimestre de 2020 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes disminuyó 3,6% con relación al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 27,7% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-26,5%), el valor agregado de las actividades especializadas (-27,5%) y el valor agregado de las obras civiles (-29,6%).

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

**Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 2016 – 2020<sup>Pr</sup> (IV trimestre)**

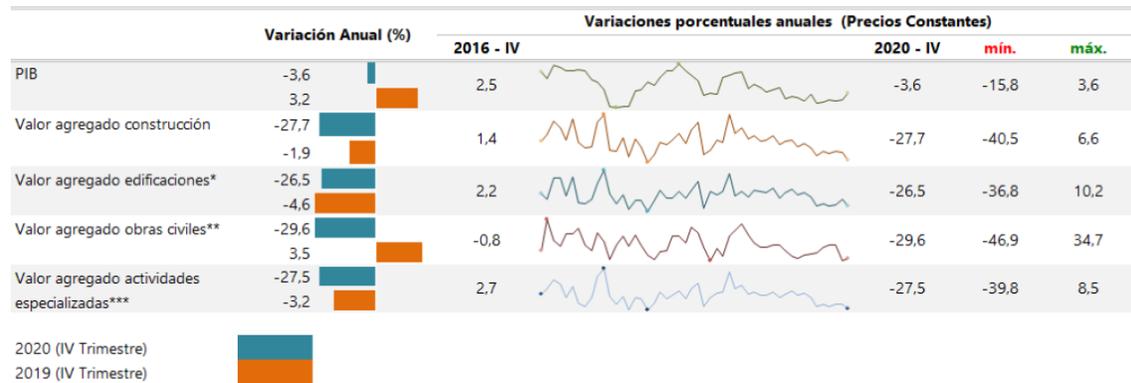

**Fuente:** DANE, Cuentas trimestrales.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

\* El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.

\*\* Incluye construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.

\*\*\* A partir del primer trimestre del año 2018 se realiza cambio del año base a 2015 y se incorpora actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2020 (octubre – diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que cada uno de estos países presentó un decrecimiento significativo, la mayor disminución es presentada por México (-4,3%). En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa un decrecimiento en dos de los países de análisis, Colombia (-27,7%) y México (-9,8%), siendo más significativo el de Colombia. Por el contrario, en Perú se observa un importante crecimiento del 19,0% con relación al mismo trimestre de 2019.



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

**Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica<sup>2</sup>**  
**Variación anual**  
**2018 (IV trimestre) – 2020<sup>Pr</sup> (IV trimestre)**

	Variación anual (%)		PIB Variación anual (%) (Precios Constantes)				Valor agregado de la construcción Variación anual (%) (Precios Constantes)			
	PIB	Valor agregado de la construcción	2018 - IV	2020 - IV	mín.	máx.	2018 - IV	2020 - IV	mín.	máx.
Colombia	-3,6 3,2	-27,7 -1,9	2,9	-3,6	-15,8	3,6	1,0	-27,7	-40,5	2,1
México	-4,3 -0,6	-3,8 -6,2	1,3	-4,3	-18,7	3,2	-5,5	-3,8	-34,0	5,1
Perú	-1,7 1,9	19,0 -4,1	4,7	-1,7	-30,0	5,5	7,9	19,0	-64,1	19,0

IV trim 2020  
IV trim 2019

**Fuente:** DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Perú).

Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

<sup>2</sup> Para ampliar información sobre PIB Latinoamérica consulte:

<http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales>

<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33704>

<https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/cuentas-nacionales-trimestrales-9747/>



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR



Bogotá D.C  
12 de febrero de 2021


Boletín Técnico

Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)  
Cuarto trimestre de 2020

Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)

IV trimestre de 2020

Gráfico 1. Variación anual y doce meses de pagos y obligaciones en obras civiles  
Total nacional  
IV trimestre 2020<sup>Pr</sup>

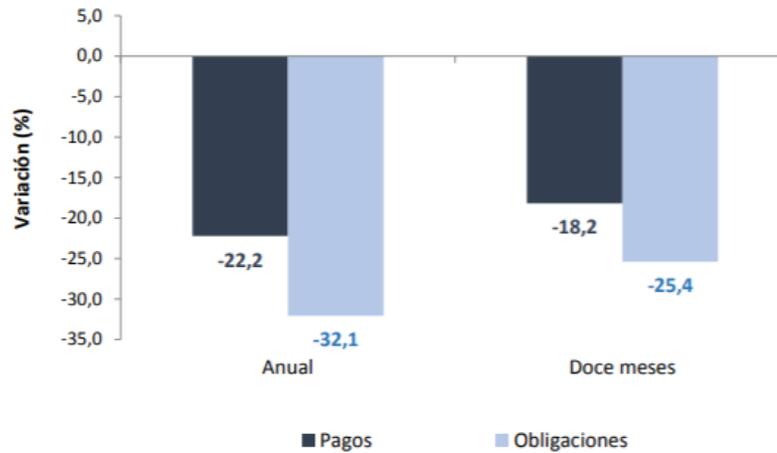

Fuente: DANE, IIOC.  
Pr: preliminar


ANÁLISIS DEL SECTOR

1. INDICADOR DE PAGOS

1.1 Resultados generales

Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 22,2%, frente al mismo trimestre de 2019 (Anexo A1).

Gráfico 2. Índice y variación anual de los pagos en obras civiles  
Total nacional – serie empalmada  
2015 – 2020<sup>Pr</sup> (IV trimestre)

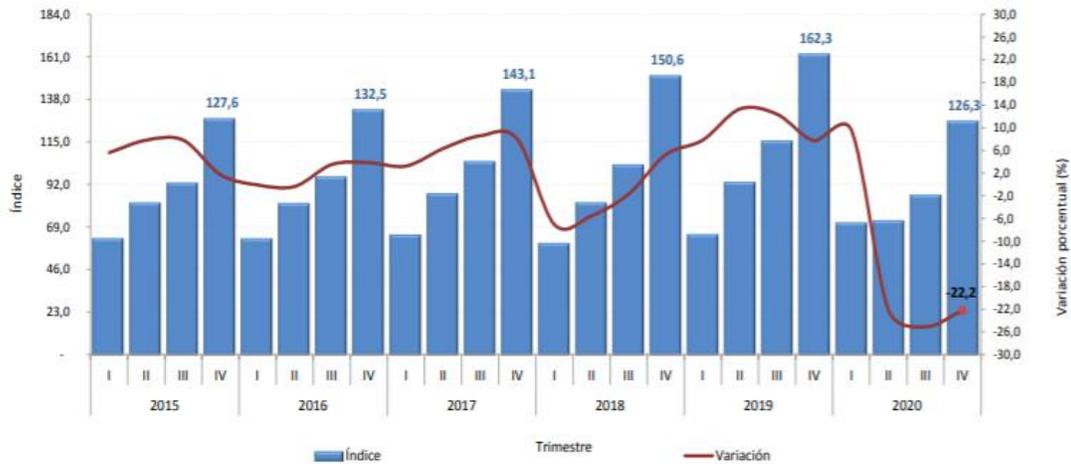

Fuente: DANE, IIOC.  
Pr: preliminar



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

1.2 Resultados por tipo de construcción

1.2.1. Variación anual (IV trimestre de 2020<sup>Pr</sup> / IV trimestre 2019)

A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020 (Anexo A1).

Cuadro 1. Variación y contribución anual de los pagos según tipo de construcción

Total nacional

IV trimestre 2020<sup>Pr</sup> / IV trimestre 2019

Tipo de construcción	Variación anual (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
<b>Total</b>	<b>-22,2</b>	<b>-22,2</b>
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos	-20,0	-8,9
Otras obras de ingeniería*	-58,4	-6,4
Construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte	-17,0	-6,0
Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias	-9,9	-0,7
Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo	-10,5	-0,2

Fuente: DANE, IIOC.

Pr: preliminar

\*Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos de 20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la variación anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas.

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

**Gráfico 3. Índice y variación anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos**  
**Total nacional – serie empalmada**  
**2015 – 2020<sup>Pr</sup> (IV trimestre)**



Fuente: DANE, IIOC.

Pr: preliminar

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de entidades territoriales presentó una disminución de 33,1% respecto al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -13,4 puntos porcentuales a la variación del grupo (-20,0%) (Cuadro 2).



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

**Cuadro 2. Variación y contribución anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos por tipo de entidad  
IV trimestre 2020<sup>Pr</sup> / IV trimestre 2019**

<b>Tipo de entidad</b>	<b>Variación anual (%)</b>	<b>Contribución (p.p)</b>
Nacionales	-14,9	-3,3
Territoriales	-33,1	-13,4
Otras*	-8,6	-3,2
<b>Total</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>

**Fuente:** DANE, IIOC.

Pr: preliminar

\* Otras incluye empresas privadas, concesiones viales y empresas de servicios públicos.


Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingeniería<sup>1</sup> presentó una disminución de 58,4% en sus pagos y restó 6,4 puntos porcentuales a la variación anual. Las categorías que más incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de obras ambientales, parques y escenarios deportivos.

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

**Gráfico 4. Índice y variación anual de los pagos de otras obras de ingeniería  
Total nacional – serie empalmada  
2015 – 2020<sup>Pr</sup> (IV trimestre)**

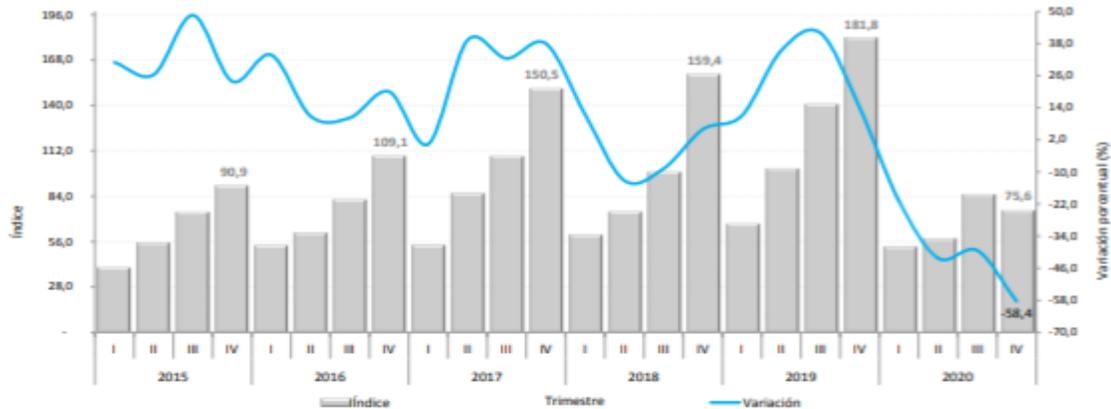

Fuente: DANE, IIOC.

Pr: preliminar

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades del orden territorial registró una disminución de 58,5% en los pagos efectuados y aportó -58,0 puntos porcentuales a la variación anual del grupo (-58,4%).

**Cuadro 3. Variación y contribución anual de los pagos de otras obras de ingeniería por tipo de entidad  
IV trimestre 2020<sup>Pr</sup> / IV trimestre 2019**

Tipo de entidad	Variación anual (%)	Contribución (p.p)
Nacionales	-53,7	-0,3
Territoriales	-58,5	-58,0
Otras*	-37,8	-0,2
<b>Total</b>	<b>-58,4</b>	<b>-58,4</b>

Fuente: DANE, IIOC.

Pr: preliminar

\* Otras incluye empresas de servicios públicos y empresas privadas.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de otras\* entidades disminuyó en 21,0% sus pagos y contribuyó con -15,0 puntos porcentuales a la variación total anual (-9,9%).

**Cuadro 5. Variación y contribución anual de los pagos de vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad  
IV trimestre 2020<sup>Pr</sup> / IV trimestre 2019**

Tipo de entidad	Variación anual (%)	Contribución (p.p)
Nacionales	-0,4	0,0
Territoriales	28,7	5,2
Otras*	-21,0	-15,0
<b>Total</b>	<b>-9,9</b>	<b>-9,9</b>

Fuente: DANE, IIOC.

Pr: preliminar

\* Otras agrupa sociedades portuarias, empresas de servicios públicos y empresas privadas.


Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.

En el cuarto trimestre de 2020, el grupo de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo presentó una disminución de 10,5% y contribuyó con -0,2 puntos porcentuales a la variación anual. La categoría que más incidió en este resultado fue la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de sistemas de transporte masivo e infraestructura aeroportuaria.

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

**Gráfico 7. Índice y variación anual de los pagos de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo**  
**Total nacional – serie empalmada**  
**2015 – 2020<sup>Pr</sup> (IV trimestre)**

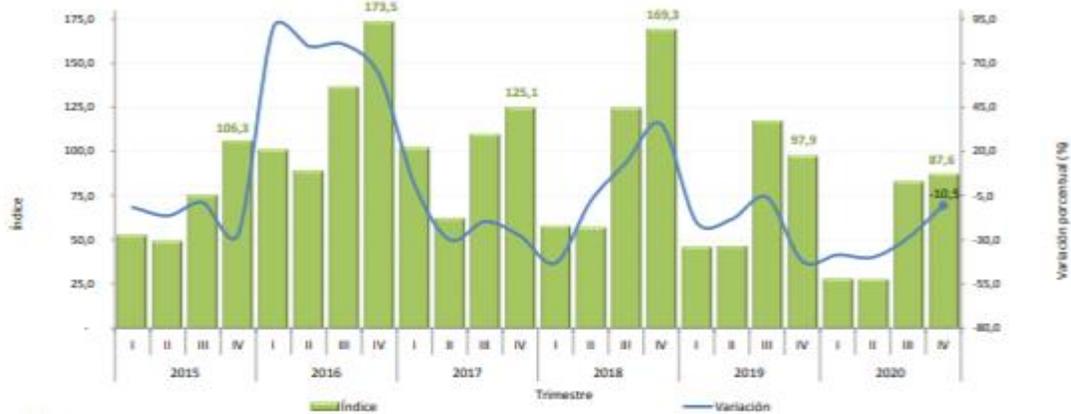

Fuente: DANE, IIOC.  
Pr: preliminar

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades territoriales registró una disminución de 45,0% en los pagos efectuados y aportó 16,9 puntos porcentuales negativos a la variación anual del grupo (-10,5%).

**Cuadro 6. Variación y contribución anual de los pagos de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo por tipo de entidad**  
**IV trimestre 2020<sup>Pr</sup> / IV trimestre 2019**

Tipo de entidad	Variación anual (%)	Contribución (p.p)
Nacionales	30,8	6,5
Territoriales	-45,0	-16,9
Otras*	-0,5	-0,2
<b>Total</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>

Fuente: DANE, IIOC.  
Pr: preliminar

\*Otras agrupa concesiones férreas, aeropuertos concesionados, sistemas de transporte masivo y empresas privadas.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

**ANALISIS TECNICO**

Las especificaciones técnicas del objeto a contratar, se encuentran descritas en Anexo Técnico y el Estudio Previo los cuales incluyen la descripción de las actividades e información técnica, objeto del presente proceso de selección, el cual consiste en las obras de mitigación de la erosión y control de inundaciones en el jarillón que comprende los tramos críticos entre los corregimientos de Santa Coita y Punta Cartagena, en el Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar.

**ASPECTO REGULATORIO**

De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes normas:

1. Constitución Política de Colombia
2. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la administración pública.
3. Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
4. Decreto 1082 de 2015, por la cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

**2. ANALISIS DE LA DEMANDA**

Para analizar la demanda de este tipo de proceso la Gobernación de Bolívar, tomo como referente procesos convocados en la región con características similares, los contratados por nuestra entidad y en general a nivel nacional lo contratado por licitación pública con objetos similares.

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatal</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fech</u> <u>a de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuántía</u>	<u>Estado</u>
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	DC-CD-CIN-043-2021	Convenio interadministrativo	Presentación de oferta	21/05/2021 2:42 PM (UTC -5 horas)	-	<b>3.707.852.311 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-006-2021 (Presentación de oferta)	"MANTENIMIENTO DE MUELLES FLUVIALES A CARGO DEL INVIAS" (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	10/05/2021 5:39 PM (UTC -5 horas)	28/05/2021 4:00 PM (UTC -5)	<b>495.085.561 COP</b>	Publicado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
						horas )		
	MUNICIPIO DE MEDELLIN	70007156 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Construcción de obras hidráulicas y complementarias en quebrada la Picacha Sector Pacha Mama (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	27/04/2021 9:10 PM (UTC -5 horas)	11/05/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>1.153.907.833 COP</b>	Proceso en evaluación y observaciones
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-008-2021 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PUERTO NARIÑO - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	27/04/2021 7:44 PM (UTC -5 horas)	11/05/2021 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>5.058.129.762 COP</b>	Proceso en evaluación y observaciones
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-006-2021 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES A CARGO DEL INVIAS A NIVEL NACIONAL - FASE 2 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	26/03/2021 6:46 PM (UTC -5 horas)	15/04/2021 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>7.505.096.483 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	SGR-OS-RE-028-2020	REALIZAR OBRAS DE MITIGACION Y RECUPERACION EN DISTINTOS PUNTOS CRITICOS DE DRENAJES NATURALES Y CONTRUCCION DE BOX CULVERT EN EL SECTOR DE	Presentación de oferta	12/01/2021 11:47 AM (UTC -5 horas)	-	<b>2.253.456.896 COP</b>	Publicado



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
			CORMONARES PARAISO	-				
	GOBERNACION DEL CAUCA	DC-SI-SAMC-04-2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DEL RIO MICAY, MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	31/12/2020 10:12 AM (UTC -5 horas)	7/01/2021 11:00 AM (UTC -5 horas)	<b>3.568.494.476,03 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	FONDO ADAPTACION	FA-SAMC-IS-002-2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	23/12/2020 5:37 PM (UTC -5 horas)	13/01/2021 3:00 PM (UTC -5 horas)	<b>538.640.729 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA	1SA-037-2020 (Presentación de oferta)	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	14/12/2020 6:45 PM (UTC -5 horas)	18/12/2020 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>3.720.649.386 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>í</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	MUNICIPIO DE MONTERIA	LP-SIM-011-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS DEL PROYECTO DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL – BUSINU (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	4/12/2020 4:51 PM (UTC -5 horas)	17/12/2020 8:30 AM (UTC -5 horas)	<b>9.348.687.167 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-058-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LOS MUNICIPIOS DE BOJAYA, ATRATO, LLORÓ, SIPÍ Y MEDIO BAUDO (DEPARTAMENTO DE CHOCO) EN LAS COMUNIDADES DE BUENAVISTA Y PIÑUÑA BLANCO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (DEPA	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	24/11/2020 9:16 PM (UTC -5 horas)	3/12/2020 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>12.791.618.529 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	UAESP-LP-03-2020. (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR MOCHUELO BAJO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	18/11/2020 10:50 PM (UTC -5 horas)	1/12/2020 3:00 PM (UTC -5 horas)	<b>4.544.046.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-052-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA. VALLE DEL CAUCA (Fase de Selección	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	11/11/2020 9:10 PM (UTC -5 horas)	23/11/2020 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>25.014.752.790 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
		ación de ofertas))	(Presentación de ofertas))	de oferta s)				
	ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA	1L-004- 2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Pres entación de oferta s)	27/10/20 20 6:10 PM (UTC -5 horas)	6/11/ 2020 9:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>3.720.649.386 COP</b>	Proceso cancelad o
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO- SMF- 037-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE CABUYARO - META (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Pres entación de oferta s)	21/10/20 20 7:04 PM (UTC -5 horas)	5/11/ 2020 4:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>2.499.745.129 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO- SMF- 043-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA PASARELA DE ACCESO AL MUELLE FLOTANTE VICTORIA REGIA, LETICIA, AMAZONAS (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Pres entación de oferta s)	18/09/20 20 9:09 PM (UTC -5 horas)	5/10/ 2020 4:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>15.682.453.081 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	UNIDAD ADMINISTRA TIVA ESPECIAL DE AERONÁUTI CA CIVIL AEROCIVIL	2000104 1 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) (Present	RATC1008 REALIZAR LA CONSTRUCCION DE CANALES DE DRENAJES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA (Manifestación de	Prese ntación de oferta	10/09/20 20 12:24 PM (UTC -5 horas)	18/09 /2020 10:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>380.280.106 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuántía	Estado
		ación de oferta)	interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)					
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-017-2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL MUELLE LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	2/09/2020 6:16 PM (UTC -5 horas)	10/09/2020 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>356.367.065 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0070007031 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	PP - Ejecución de intervenciones en mantenimiento y obras complementarias de quebradas para la prevención, mitigación y control de eventos hidrológicos (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	4/08/2020 7:46 PM (UTC -5 horas)	19/08/2020 2:00 PM (UTC -5 horas)	<b>2.164.677.234 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-015-2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO JIGUAMIANDÓ Y SU AFLUENTE CAÑO SECO, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN, DEPARTAMENTO DEL	Presentación de oferta	4/08/2020 10:27 AM (UTC -5 horas)	13/08/2020 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>870.042.782 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
			CHOCÓ (Manifestación de interés)					
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	DC-CD-CIN-014-2020	Convenio Interadministrativo	Presentación de oferta	28/07/2020 6:52 PM (UTC -5 horas)	-	<b>9.348.687.176 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	PN DIRAN SA MC 069 2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	DESARROLLO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL CULTIVO EXPERIMENTAL DE COCA EN EL CENOP (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	28/07/2020 8:31 AM (UTC -5 horas)	30/07/2020 11:00 AM (UTC -5 horas)	<b>298.218.403 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC.DO-SMF-012-2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO CHINTADÓ, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	27/07/2020 3:14 PM (UTC -5 horas)	4/08/2020 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>773.032.368 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-036-2020	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL	Presentación de oferta	27/07/2020 12:58	27/08/2020 4:00	<b>2.499.745.129 COP</b>	Proceso cancelado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
			MUELLE DE CABUYARO - META	observaciones	PM (UTC -5 horas)	PM (UTC -5 horas)		
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	IP-DO-SMF-015-2020	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO JIGUAMIANDÓ, MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	Presentación de oferta	11/06/2020 4:11 PM (UTC -5 horas)	18/06/2020 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>87.292.013 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	IP-DO-SMF-013-2020	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO CHINTADÓ, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	Presentación de oferta	8/06/2020 4:09 PM (UTC -5 horas)	12/06/2020 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>86.842.187 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRES	033-ARC-CBN4-2020 copia (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	033-ARC-CBN4-2020 copia (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	4/06/2020 7:55 PM (UTC -5 horas)	12/06/2020 8:00 AM (UTC -5 horas)	<b>651.094.602,59 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRES	027-ARC-CBN4-2020 (Manifestación de interés	MANTENIMIENTO RAMPA DE VARADA EGSAI (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	18/05/2020 6:27 PM (UTC -5 horas)	20/05/2020 3:00 PM (UTC -5 horas)	<b>606.351.733,33 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
		(Menor Cuantía) (Presentación de oferta)				horas )		
	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRES	033- ARC- CBN4- 2020	CONSTRUCCION DE UN MUELLE FLOTANTE	Prese ntació n de obser vacio nes	13/05/20 20 1:50 PM (UTC -5 horas)	8/06/ 2020 10:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>651.094.602,59 COP</b>	Proceso cancelad o
	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA	0101- ARC- CBN6- 2020	EMBARCADEROS ARAUCA	Prese ntació n de oferta	8/05/202 0 7:03 PM (UTC -5 horas)	14/05 /2020 10:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>3.188.306.155,45 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO- SMF- 009-2020 (Fase de Selecció n (Present ación de ofertas))	DRAGADO DE MANTENIMIENTO BOCA COQUITO RIO ATRATO, GOLFO DE URABÁ. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selecc ión (Pres entaci ón de oferta s)	27/04/20 20 8:39 PM (UTC -5 horas)	15/05 /2020 4:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>5.819.243.567 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	IP-DO- SMF- 005-2020	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DESEMBOCADURA BOCA COQUITO EN EL RIO ATRATO, MUNICIPIO DE TURBO, GOLFO DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Prese ntació n de oferta	24/04/20 20 2:37 PM (UTC -5 horas)	30/04 /2020 4:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>85.514.408 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>aí</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR	FNTCC-022-2020	REALIZAR PERITAJE SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA GEOMETRÍA Y LOS SISTEMAS DE CONEXIÓN DE LA BARRERA ANTI-OLEAJE DISEÑADA EN EL CONTRATO No. FNT-073-2014 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCI	Prese ntació n de oferta	13/04/20 20 4:59 PM (UTC -5 horas)	-	<b>35.700.000 COP</b>	Publicad o
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC-VALLEDUPAR	MC-042-CENACVAL-2020	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR"	Prese ntació n de oferta	31/03/20 20 11:31 AM (UTC -5 horas)	2/04/ 2020 10:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>77.527.564 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	FNGRD-SAMC-008-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Realizar el reforzamiento estructural del muelle ubicado en el Parque Regional Johnny Cay del departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (Manifestación de interés (Menor Cuant	Prese ntació n de oferta	22/01/20 20 4:01 PM (UTC -5 horas)	23/01/ /2020 3:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>334.166.390,36 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estat</u> <u>al</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	FNGRD-SAMC-002-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	REALIZAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MUELLE UBICADO EN EL PARQUE REGIONAL JOHNNY CAY DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Manifestación de interés (Menor Cuantía))	Presentación de oferta	22/11/2019 6:17 PM (UTC -5 horas)	25/11/2019 3:00 PM (UTC -5 horas)	<b>334.166.390 COP</b>	Proceso cancelado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-058-2019 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	13/11/2019 8:24 PM (UTC -5 horas)	26/11/2019 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>869.833.465 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-057-2019 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE BUENAVENTURA Y TUMACO, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DE CAUCA Y NARIÑO (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	7/11/2019 7:18 PM (UTC -5 horas)	25/11/2019 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>35.099.677.472 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-054-2019 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. RIO ISCUANDÉ (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	17/10/2019 5:38 PM (UTC -5 horas)	31/10/2019 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>2.917.414.525 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	4162.010.32.1.527-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	GRUPO 9-II (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	10/09/2019 9:22 PM (UTC -5 horas)	16/09/2019 3:00 PM (UTC -5 horas)	<b>91.588.785 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-014-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MANTENIMIENTO DEL FERRY DE SOPLAVIENTO, MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	19/07/2019 5:13 PM (UTC -5 horas)	29/07/2019 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>107.000.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA	4162.010.32.1.482-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía))	ADECUACIONES GRUPO 9 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	11/07/2019 5:26 PM (UTC -5 horas)	18/07/2019 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>91.588.785 COP</b>	Proceso en evaluación y observaciones



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
	RECREACIÓ N	(Present ación de oferta)						
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO- SMF- 022-2019 (Fase de Selecció n (Present ación de ofertas))	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL ESTERO SAN ANTONIO, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selecc ión (Pres entaci ón de oferta s)	4/07/201 9 5:19 PM (UTC -5 horas)	18/07 /2019 4:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>15.114.136.556 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	DEPARTAME NTO DE ANTIOQUIA	9969 (Fase de Selecció n (Present ación de ofertas))	IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA EN EL CAÑO ATASCOSO DE CAUCASIA, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. BPIN 2018000	Fase de Selecc ión (Pres entaci ón de oferta s)	4/07/201 9 3:15 PM (UTC -5 horas)	26/07 /2019 8:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>5.104.259.542 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	DEPARTAME NTO DE ANTIOQUIA	9707 (Fase de Selecció n (Present ación de ofertas))	CONSTRUIR OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN EN LA ZONA SUR - OESTE DEL VOLCÁN DE LODO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, BPIN 2018000040029 (Fase de Selección (Presen	Fase de Selecc ión (Pres entaci ón de oferta s)	2/07/201 9 6:37 PM (UTC -5 horas)	23/07 /2019 8:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>11.475.837.852 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-007-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE VICTORIA REGIA EN LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	6/06/2019 4:14 PM (UTC -5 horas)	14/06/2019 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>356.718.328 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-009-2019 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	MANTENIMIENTO DEL RÍO JIGUAMIANDÓ, CUENCA DEL RÍO ATRATO, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	31/05/2019 10:37 PM (UTC -5 horas)	17/06/2019 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>860.787.850 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-005-2019 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE CURBARADÓ - MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN- CHOCÓ (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	16/05/2019 8:17 PM (UTC -5 horas)	30/05/2019 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>1.199.980.964 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-030-2018 (Presentación de oferta)	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	6/11/2018 7:48 PM (UTC -5 horas)	21/11/2018 9:00 AM (UTC -5 horas)	<b>18.882.675.342 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-020-2018 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA NARIÑO RÍO PATÍA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	31/07/2018 2:38 PM (UTC -5 horas)	9/08/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>269.993.642 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-027-2018 (Presentación de oferta)	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PIE DE PATÓ, MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	30/07/2018 5:22 PM (UTC -5 horas)	15/08/2018 9:00 AM (UTC -5 horas)	<b>862.630.212 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	IP-DO-SMF-012-2018	MANTENIMIENTO MUELLE LA BANQUETA	Presentación de oferta	5/07/2018 2:09 PM (UTC -5 horas)	9/07/2018 11:00 AM (UTC -5 horas)	<b>40.000.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	IP-DO-SMF-010-2018	MUELLE LA ESMERALDA	Presentación de oferta	25/06/2018 4:28 PM (UTC -5 horas)	27/06/2018 2:00 PM (UTC -5 horas)	<b>57.611.573 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-017-2018 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDÉ-NARIÑO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	20/06/2018 8:15 PM (UTC -5 horas)	28/06/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>289.997.006 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-014-2018 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA TOLA NARIÑO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	1/06/2018 12:26 PM (UTC -5 horas)	8/06/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>269.999.541 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-023-2018 (Presentación de oferta)	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE ORILLA EN EL MUELLE DE CABUYARO- DEPARTAMENTO DEL META-RÍO META (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	15/05/2018 5:06 PM (UTC -5 horas)	28/05/2018 9:00 AM (UTC -5 horas)	<b>866.561.500 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-011-2018 (Presentación de oferta)	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN MARÍTIMA FLUVIAL GOLFO DE URABÁ RIO ATRATO, BOCA COQUITO (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	3/04/2018 8:58 PM (UTC -5 horas)	17/04/2018 9:00 AM (UTC -5 horas)	<b>4.717.652.762 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	LP-DO-SMF-012-2018 (Presentación de oferta)	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO, NARIÑO (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	3/04/2018 8:54 PM (UTC -5 horas)	17/04/2018 9:00 AM (UTC -5 horas)	<b>6.453.282.463 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-007-2018 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL DE PIÑUÑA NEGRO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	2/04/2018 4:12 PM (UTC -5 horas)	10/04/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>655.767.137 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SMF-005-2018 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MANTENIMIENTO DEL FERRY PIAMONTE, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	14/03/2018 10:26 AM (UTC -5 horas)	21/03/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>88.000.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	SA-MC-DO-SRT-004-2018	MANTENIMIENTO DEL FERRY PIAMONTE, EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Presentación de observaciones	27/02/2018 12:46 PM (UTC -5 horas)	21/03/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>88.000.000 COP</b>	Proceso cancelado



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	GOBERNACION DE SUCRE	CDCP-SID-001-2021	CALAMIDAD PÚBLICA - SUMINISTRO	Presentación de oferta	20/05/2021 10:25 PM (UTC -5 horas)	-	<b>594.000.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA	UAEGRD-LP-046-2021 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	LICITACIÓN OBRA PÚBLICA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	20/05/2021 4:18 PM (UTC -5 horas)	2/06/2021 11:00 AM (UTC -5 horas)	<b>34.088.474.664,23 COP</b>	Publicado
	MUNICIPIO DE PEREIRA-OFICIAL	SMI-LP-068-2021 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	LICITACION PUBLICA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LADERA SUR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA 1 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	19/05/2021 5:37 PM (UTC -5 horas)	23/06/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>1.925.748.810 COP</b>	Publicado
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-LP-SGDU-002-2021 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DE	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	14/05/2021 5:46 PM (UTC -5 horas)	31/05/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>5.434.379.701 COP</b>	Publicado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
			METRO PARA BOGOTÁ D.C. (Fase					
	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEL AMBIENTE	SA-LP-001-2021	LP - BALSILLAS	Presentación de observaciones	14/05/2021 4:29 PM (UTC -5 horas)	22/06/2021 9:00 AM (UTC -5 horas)	<b>6.575.502.125 COP</b>	Publicado
	MUNICIPIO DE TUNJA	SMC-AMT-0132021	SI-100 - ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE, UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO	Presentación de oferta	24/03/2021 5:50 PM (UTC -5 horas)	5/04/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>40.070.955 COP</b>	Proceso cancelado
	MUNICIPIO DE UBATÉ	UAEDUI-CPS-033-2021	GONZALO VELA MONTAÑO	Presentación de oferta	11/03/2021 5:20 PM (UTC -5 horas)	-	<b>3.750.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL INEM LUIS DELFÍN	SA-001-2021	READECUACION UNIDADES SANITARIAS DE LA SEDE AGUALONGO Y REFUERZO DE PLACA DE CONCRETO	Presentación de observaciones	25/02/2021 2:11 PM (UTC -5 horas)	31/03/2021 2:00 PM (UTC -5 horas)	<b>80.493.108 COP</b>	Publicado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

<u>Países</u>	<u>Entidad Estatal</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase actual</u>	<u>Fecha de publicación</u>	<u>Fecha de presentación de ofertas</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	INSUASTY RODRIGUEZ		CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA MISMA SEDE			horas )		
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO SA ESP	INVITACIÓN N°002 DE 2021	INVITACIÓN N°002 DE 2021	Presentación de oferta	18/01/2021 12:24 PM (UTC -5 horas)	-	<b>620.184.711 COP</b>	Publicado
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	SGR-OS-RE-033-2020	REALIZAR OBRAS PARA MITIGAR EL RETROCESO ACELERADO DEL SUELO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAMPLONITA	Presentación de oferta	15/01/2021 5:53 PM (UTC -5 horas)	-	<b>1.121.315.282 COP</b>	Publicado
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	SGR-OS-RE-031-2020	REALIZAR OBRAS DE PROTECCION Y MITIGACION EN EL SECTOR MANUELA BELTRAN - ARRAYANES- QUEBRADA TONCHALA	Presentación de oferta	14/01/2021 11:25 AM (UTC -5 horas)	-	<b>2.542.049.637 COP</b>	Publicado
	MUNICIPIO DE MEDELLIN	30184	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITA	Presentación de oferta	29/12/2020 6:41 PM (UTC -5 horas)	4/01/2021 2:00 PM (UTC -5 horas)	<b>623.031.756 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	MUNICIPIO DE MEDELLIN	70007093	Construcción de sistemas de acueducto y saneamiento básico en la vereda La Verde, San Antonio de Prado.	Presentación de observaciones	29/12/2020 5:16 PM (UTC -5 horas)	9/02/2021 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>3.777.242.735 COP</b>	Proceso cancelado
	MUNICIPIO DE SINCELEJO	MÍNIMA CUANTÍA 069-2020	CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLAS	Presentación de oferta	25/11/2020 3:00 PM (UTC -5 horas)	26/11/2020 3:15 PM (UTC -5 horas)	<b>56.700.775 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	IT-CD-20-0012	CONVENIO PIEDECUESTANA	Presentación de oferta	13/11/2020 9:20 AM (UTC -5 horas)	17/11/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	<b>2.949.488.194 COP</b>	Proceso cancelado
	GOBERNACION DE CORDOBA	SI-MIC-015-2020	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA SEDE SAHAGÚN, MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DEL AUDITORIO Y LA CANCHA ACÚSTICA EXISTENTE Y LIMPIEZA DEL LAGO EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA EN E	Presentación de oferta	4/11/2020 7:04 PM (UTC -5 horas)	6/11/2020 6:00 PM (UTC -5 horas)	<b>81.880.642 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	GOBERNACION DE SUCRE	CP-SGD-001-2020	SUMINISTRO DE HORA DE MAQUINARIA PARA LA RESPUESTA Y RECUPERACION DE LA EMERGENCIA GENERADA EN LOS MUNICIPIOS DE COROZAL Y GUARANDA, DE ACUERDO A LA CALAMIDAD PUBLICA DEPARTAMENTAL DECLARADA MEDIANTE	Presentación de oferta	30/10/2020 6:11 PM (UTC -5 horas)	-	<b>480.810.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	SGR-MC-004-2020	OBRA REDUCCION DEL RIESGO RIO PAMPLONITA	Presentación de oferta	26/10/2020 5:52 PM (UTC -5 horas)	28/10/2020 7:30 AM (UTC -5 horas)	<b>87.250.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE PEREIRA-OFICIAL	SMI-SA-121-2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) (Presentación de oferta)	OBRAS DE DEMOLICION EDIFICACION UBICADA EN LA AVENIDA 30 DE AGOSTO No. 59-03/07 Y AVENIDA 30 DE AGOSTO No. 59-19 CON FICHAS CATASTRALES Nos. 01-08-0135-0009-000 Y 01-08-0135-0001-000 DEL MUNICIPIO	Presentación de oferta	23/09/2020 7:36 PM (UTC -5 horas)	28/09/2020 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>249.991.827 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE MEDELLIN	70007043 (Fase de Selección (Presentación de oferta)	PP- Construcción de obras de mitigación en las comunas y corregimientos de los costados oriental y occidental de la ciudad	Fase de Selección (Presentación de oferta)	11/09/2020 8:19 PM (UTC -5 horas)	29/09/2020 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>2.528.960.667 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
		ación de ofertas))	de Medellín (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	ón de ofertas)		horas)		
	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJERCITO	LP-004-ICFE-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE ÁREAS COMUNES PARA LAS VIVIENDAS DEL INSTITUTO DE CASAS FICALES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL” (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	2/09/2020 9:06 PM (UTC -5 horas)	16/09/2020 11:00 AM (UTC -5 horas)	<b>840.598.013 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE MONTERIA	LP-SPM-006-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	26/08/2020 6:37 PM (UTC -5 horas)	4/09/2020 8:00 AM (UTC -5 horas)	<b>2.511.000.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	GOBERNACION DE CORDOBA	SI-LP-017-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LOS BARRIOS SAN JORGE Y EN MUCHA JAGUA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	4/08/2020 6:23 PM (UTC -5 horas)	14/08/2020 9:00 AM (UTC -5 horas)	<b>1.291.176.380 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuántia	Estado
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL	20000909 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	RMTC0842 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO Y ESTACIÓN AERONAUTICA UBICADOS EN LA CIUDAD DE MITU (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de of	Presentación de oferta	18/07/2020 1:41 PM (UTC -5 horas)	31/07/2020 8:00 AM (UTC -5 horas)	<b>163.893.083,39 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SID-LP-009-2020 (Presentación de oferta)	CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	6/07/2020 7:14 PM (UTC -5 horas)	14/07/2020 9:00 AM (UTC -5 horas)	<b>939.386.404,78 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL	20000532 H4 A	RMTC0842 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO Y ESTACIÓN AERONAUTICA UBICADOS EN LA CIUDAD DE MITU	Presentación de observaciones	24/06/2020 6:13 PM (UTC -5 horas)	21/07/2020 3:00 PM (UTC -5 horas)	<b>204.866.354,23 COP</b>	Proceso cancelado
	GOBERNACIÓN DE CORDOBA	SI-LP-013-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LOS BARRIOS SAN JORGE Y EN MUCHAJAGUA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	28/05/2020 10:45 PM (UTC -5 horas)	8/06/2020 9:00 AM (UTC -5 horas)	<b>1.291.176.380 COP</b>	Proceso cancelado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA	LP-002- 2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Pres entación de oferta s)	28/05/20 20 5:23 PM (UTC -5 horas)	17/06 /2020 9:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>11.833.989.005 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	GOBERNACI ÓN DE BOYACÁ	CD- 0217- 2020	CONTRATO INTERADMINISTRATIV O	Prese ntación de oferta	6/05/202 0 4:09 PM (UTC -5 horas)	-	<b>899.960.975 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	DEPARTAME NTO DEL META	GCSJ- MC-011- 2020	ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO- EXCAVADORA SOBRE ORUGA	Prese ntación de oferta	27/04/20 20 2:19 PM (UTC -5 horas)	29/04 /2020 9:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>73.827.600 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	ALCALDIA LOCAL DE USME	LP-014- FDLU- 2019 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	VIAS RURALES 2019 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Pres entación de oferta s)	18/06/20 19 7:20 PM (UTC -5 horas)	8/07/ 2019 11:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>6.900.000.000 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	GOBERNACI ÓN DEL HUILA	SDACM COP002- 19	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS DE AGUA EN TIERRA PARA IRRIGACION DE CULTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE BARAYA, RIVERA Y CAMPOALEGRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	Prese ntación de oferta	12/03/20 19 5:28 PM (UTC -5 horas)	18/03 /2019 3:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>52.132.500 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	FDLAN-MC-018-2018	DEMOLICIONES	Presentación de oferta	20/12/2018 11:07 PM (UTC -5 horas)	26/12/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>21.806.799 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE MEDELLIN	25520	PP- Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para elaborar estudios, diseños y construcción de obras de mitigación en la ciudad de Medellín y sus corregimientos.	Presentación de oferta	20/12/2018 2:55 PM (UTC -5 horas)	20/12/2018 4:05 PM (UTC -5 horas)	<b>2.300.000.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO (oficial)	FDLT-SA-MC-029-2018 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) (Presentación de oferta))	DEMOLICIONES (Manifestación de interés (Menor Cuantía) (Presentación de oferta))	Presentación de oferta	16/12/2018 4:22 PM (UTC -5 horas)	18/12/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>40.000.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	GOBERNACION DE CALDAS	SA-SV-021-2018	OBRAS Y REPARACIONES LOCATIVAS EN PTAP RURALES	Presentación de observaciones	20/11/2018 9:39 AM (UTC -5 horas)	3/12/2018 11:00 AM (UTC -5 horas)	<b>698.271.468 COP</b>	Proceso cancelado



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	GOBERNACION DE CALDAS	SA-SV-010-2018 (Presentación de oferta)	OBRAS Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE ARBOLEDA, PUEBLO NUEVO, BOLIVIA, MALTERÍA, SAN FÉLIX, TAPIAS, ISAZA,	Presentación de oferta	5/10/2018 4:46 PM (UTC -5 horas)	18/10/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>698.271.468 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 1	095-GINRED 1-2018	Demolición y retiro completo de la estructura en concreto que hizo parte de la antigua base del faro de Pasacaballos” en el municipio de Pasacaballos, Departamento de Nariño	Presentación de oferta	13/08/2018 10:54 AM (UTC -5 horas)	14/08/2018 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>78.064.342 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	MUNICIPIO DE EL BAGRE	SAMEC – No. 017 DE 2021 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE PROTECCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR "CPSAM", ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Manife	Presentación de oferta	21/05/2021 4:19 PM (UTC -5 horas)	24/05/2021 4:30 PM (UTC -5 horas)	<b>82.148.824 COP</b>	Proceso en evaluación y observaciones



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatal</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL CARIBE	FGN- RCA- MEC- 0021- 2021 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	ADECUACIONES LOCATIVAS REGIONAL CARIBE (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Prese ntació n de oferta	18/05/20 21 9:07 AM (UTC -5 horas)	24/05 /2021 9:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>526.947.697 COP</b>	Proceso en evaluaci ón y observac iones
	DISPENSARI O MEDICO DE MEDELLÍN	354- DIGSAE JC- DMMED- 2021_2 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	354-DIGSAEJC- DMMED-2021_2 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selecc ión (Pres entaci ón de oferta s)	13/05/20 21 6:21 PM (UTC -5 horas)	28/05 /2021 8:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>1.839.080.000 COP</b>	Publicad o
	Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administració n Judicial	IP-07- 2021	Construcción de un muro en el predio ubicado en la KR 14B 0-56 Sur, en la ciudad de Bogotá D.C.	Prese ntació n de oferta	26/04/20 21 1:35 PM (UTC -5 horas)	28/04 /2021 5:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>88.435.329 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	007-00-I- CACOM- 6- GRUAL- 2021	SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA UN PERSONAL DE LA ESCUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL CACOM-6	Prese ntació n de oferta	8/02/202 1 3:58 PM (UTC -5 horas)	-	<b>60.000.000 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO SA ESP	INVITACIÓN N° 001 DE 2021	INVITACIÓN N° 001 DE 2021	Presentación de oferta	18/01/2021 12:10 PM (UTC -5 horas)	-	<b>105.980.663 COP</b>	Publicado
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	SGR-OS-RE-032-2020	REALIZAR OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO BARRIO CIRCUNVALACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	Presentación de oferta	15/01/2021 5:52 PM (UTC -5 horas)	-	<b>89.996.331,2 COP</b>	Publicado
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	SGR-OS-RE-027-2020	REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	Presentación de oferta	12/01/2021 11:01 AM (UTC -5 horas)	-	<b>1.354.346.856 COP</b>	Publicado
	SENA REGIONAL BOYACA Grupo Administrativo CGAFE	MC-BYC-CEGAFE-026-2020	Remodelación fachada sede Principal del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del SENA, Regional Boyacá.	Presentación de oferta	17/12/2020 4:44 PM (UTC -5 horas)	18/12/2020 5:00 PM (UTC -5 horas)	<b>81.595.022,98 COP</b>	Proceso cancelado
	ALCALDIA DE PASTO	IP-2020-123	adecuación, y mantenimiento de las instalaciones del centro de bienestar animal	Fase de ofertas	24/11/2020 5:44 PM (UTC -5 horas)	27/11/2020 11:00 AM (UTC -5 horas)	<b>10.294.098 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO TECNOLOGICO	MC 97 DE 2020	Mantenimiento cúpula del Observatorio Astronómico del ITM.	Presentación de oferta	13/11/2020 1:48 PM (UTC -5 horas)	18/11/2020 10:00 AM (	<b>6.126.120 COP</b>	Proceso adjudicado y



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fech</u> <u>a de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	METROPOLI TANO					UTC - 5 horas )		celebrad o
	DEFENSA CIVIL COLOMBIAN A	093 DE 2020 (Manifest ación de interés (Menor Cuantía)) (Present ación de oferta)	MANTENIMIENTO TECHOS (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Prese ntació n de oferta	4/11/202 0 6:25 PM (UTC -5 horas)	12/11 /2020 2:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>100.000.000 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 3	SAMC- 146- GINRED 3-2020 (Manifest ación de interés (Menor Cuantía)) (Present ación de oferta)	EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANDRÉS A CARGO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 3, ASI COMO	Prese ntació n de oferta	13/10/20 20 4:26 PM (UTC -5 horas)	21/10 /2020 3:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>575.000.000 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o
	MUNICIPIO DE PEQUE	PSAMC 005/2020 (Manifest ación de interés (Menor Cuantía)) (Present ación de oferta)	CONSTRUCCION CASSETAS COMUNALES EN LA VEREDA SAN MIGUEL Y EL BARRIO VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Prese ntació n de oferta	3/10/202 0 2:15 PM (UTC -5 horas)	7/10/ 2020 9:00 AM ( UTC - 5 horas )	<b>117.330.819 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA - CENAC TOLEMAIDA	MC-146 CENAC TOLEMAIDA-2020	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUESTO DE MANDO MESA BAJA-DEL CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO CENAE UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINI	Prese ntació n de oferta	3/08/2020 5:53 PM (UTC -5 horas)	4/08/2020 6:00 PM ( UTC -5 horas )	<b>55.000.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	MINIMA CUANTIA No.54 DE 2020	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cúpula del Observatorio astronómico	Prese ntació n de oferta	13/07/2020 11:30 AM (UTC -5 horas)	15/07/2020 2:00 PM ( UTC -5 horas )	<b>24.905.043 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	BANCO DE LA REPUBLICA	4300010320	Servicio de adecuación de las salas de desastres	Prese ntació n de oferta	30/06/2020 12:31 PM (UTC -5 horas)	-	<b>4.652.280 COP</b>	Proceso en evaluación y observaciones
	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI	Contrato Juridica No. 186 de 2020 CD-SINCHI	HANDITECH SAS	Prese ntació n de oferta	30/06/2020 12:03 PM (UTC -5 horas)	-	<b>12.614.238 COP</b>	Publicado



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA - CENAC TOLEMAIDA	MC-129 CENAC TOLEMAIDA-2020	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUESTO DE MANDO MESA BAJA DEL CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO-CENAC TOLEMAIDA - VIGENCIA 2020	Presentación de oferta	30/06/2020 9:25 AM (UTC -5 horas)	1/07/2020 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>55.000.000 COP</b>	Proceso cancelado
	DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 3	SAMC-111-GINRED 3-2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES DIMAR EN RIOHACHA GUAJIRA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	26/06/2020 11:17 AM (UTC -5 horas)	7/07/2020 3:00 PM (UTC -5 horas)	<b>500.000.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	DGSM-DISAN-ARCOHONAC	077-MDN-DGSM-DISAN-HONAC-2020	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Presentación de oferta	6/02/2020 10:45 AM (UTC -5 horas)	-	<b>6.844.950 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	DGSM-DISAN-ARCOHONAC	072-MDN-DGSM-DISAN-HONAC-2020	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	Presentación de oferta	5/02/2020 5:57 PM (UTC -5 horas)	-	<b>6.844.950 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>Países</u>	<u>Entidad Estatal</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase actual</u>	<u>Fecha de publicación</u>	<u>Fecha de presentación de ofertas</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
	DGSM-DISAN-ARCOHONAC	043-MDN-DGSM-DISAN-HONAC-2020	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CARPINTERO PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SUBDIRECCION OPERATIVA DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	Presentación de oferta	31/01/2020 6:47 PM (UTC -5 horas)	-	<b>6.844.950 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°15	045 BAS 15 2019	GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15 - PARTIDA FIJA GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO	Presentación de oferta	8/11/2019 5:55 AM (UTC -5 horas)	12/11/2019 8:00 AM (UTC -5 horas)	<b>70.302.904 COP</b>	Proceso en evaluación y observaciones
	BATALLON DE APOYO Y SOPORTE PARA EL COMBATE No 22	P031 BASPC2 2-2019	MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS	Presentación de oferta	5/11/2019 1:27 PM (UTC -5 horas)	7/11/2019 5:00 PM (UTC -5 horas)	<b>30.361.488 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL	19001394 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO Y CONSTRUIR LA OFICINA AIS (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	21/10/2019 5:55 AM (UTC -5 horas)	28/10/2019 2:00 PM (UTC -5 horas)	<b>359.959.614 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

<u>P</u> <u>a</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuántía	Estado
	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 19	423-BASPCN 19-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDO	Presentación de oferta	16/10/2019 10:11 AM (UTC -5 horas)	24/10/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	<b>646.779.154,39 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL	19001234 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	REALIZAR INSONORIZACION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE QUIBDÓ (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	12/09/2019 9:36 AM (UTC -5 horas)	19/09/2019 2:00 PM (UTC -5 horas)	<b>279.803.022 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL	19001054 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MANTENER LA FACHADA Y PARQUEADERO DEL EDIFICIO AEROCIVIL REGIONAL ANTIOQUIA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	14/08/2019 12:46 PM (UTC -5 horas)	26/08/2019 2:00 PM (UTC -5 horas)	<b>262.953.743 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	APOYO LOGISTICO COMANDO EJERCITO	136-APOYOL OGISTIC O-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía))	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS COMEDORES DE TROPA: BATALLÓN ENERGÉTICO Y VIAL No. 13 Y BATALLON DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL COMBATE No. 13	Presentación de oferta	26/07/2019 6:24 PM (UTC -5 horas)	31/07/2019 10:00 AM (UTC -5 horas)	<b>679.280.000 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado



**Bolívar**  
**primero**

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

<u>P</u> <u>a</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	<u>Cuantía</u>	<u>Estado</u>
		(Presentación de oferta)	"CACIQUE TISQUESUSA" (Manifestación de interés (Menor Cuantía))					
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	IDPC-SAMC-04-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	RAMPA CONCEJO DE BOGOTA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	14/05/2019 4:32 PM (UTC -5 horas)	21/05/2019 2:00 PM (UTC -5 horas)	<b>132.421.929 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - BUCARAMANGA	038-CENAC-BUCARAMANGA-2019	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y C	Presentación de oferta	26/02/2019 6:24 PM (UTC -5 horas)	1/03/2019 4:00 PM (UTC -5 horas)	<b>64.199.280 COP</b>	Proceso adjudicado y celebrado
	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	1904 DE 2016	OBRA - AVANZAR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS	Presentación de oferta	11/02/2019 11:39 AM (UTC -5 horas)	-	<b>52.121.322 COP</b>	Publicado



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

<u>P</u> <u>a</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>Entidad</u> <u>Estatad</u>	<u>Referen</u> <u>cia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase</u> <u>actua</u> <u>l</u>	<u>Fecha de</u> <u>publicaci</u> <u>ón</u>	<u>Fecha de</u> <u>prese</u> <u>ntaci</u> <u>ón de</u> <u>ofert</u> <u>as</u>	Cuantía	Estado
	DISPENSARI O MEDICO TOLEMAIDA	MÍNIMA CUANTÍ A N° 034- MDN- CGFM- DGSM- DMTOL- 2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA ADECUACION, REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA	Prese ntació n de oferta	28/06/20 18 6:57 PM (UTC -5 horas)	4/07/ 2018 5:00 PM ( UTC - 5 horas )	<b>50.000.000 COP</b>	Proceso adjudica do y celebrad o

3. ANALISIS DE LA OFERTA

INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del decreto 1082 de 2015, se tomaron como datos fundamentales la información financiera a corte 31 de diciembre de 2019, la cual a la fecha se encuentra vigente para la realización de los diferentes análisis financieros, que permitan establecer los parámetros aceptables sobre la capacidad organizacional de la entidades que deseen participar en el proceso de contratación.

Los datos para el análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional fueron obtenidos de la base completa de estados financieros 2019, emitida por la superintendencia de sociedades ([https://www.supersociedades.gov.co/delegatura\\_aec/Paginas/Base-completa-EF-2019.aspx](https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Base-completa-EF-2019.aspx)). Por lo anterior se tomó una muestra representativa de 918 empresas con actividades económicas similares al objeto a contratar. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Cuenta de Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	# de Empresas
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	748
F4312 - Preparación del terreno	36
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	134
<b>Total general</b>	<b>918</b>

LIQUIDEZ



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**


Mide la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Permite establecer la facilidad o dificultad que tienen los proponentes para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.

El objeto principal de este análisis es la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes guardando un cierto margen de seguridad en previsión de alguna situación que ponga en riesgo la ejecución del futuro contrato. Entonces se puede decir que este indicador entre más alto se considera mejor.

Tamaño de la muestra

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	918
----------------------------	-----

Grafica de dispersión

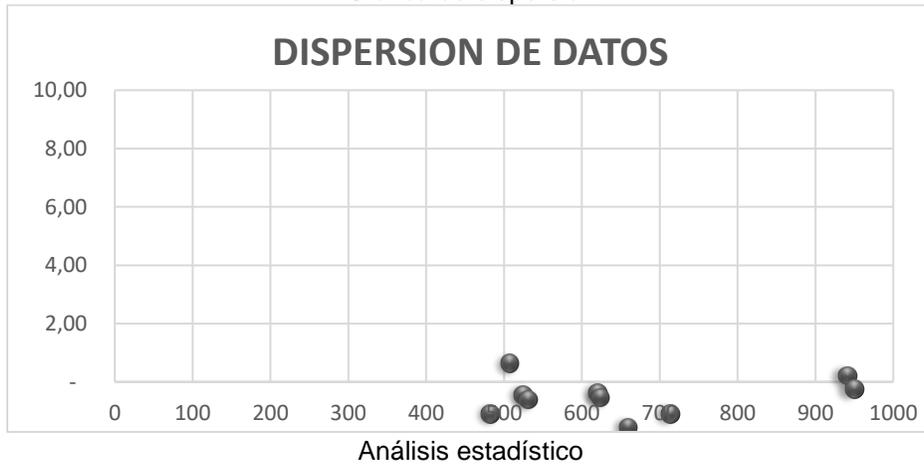

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR


ANÁLISIS DEL SECTOR

NUMERO DE DATOS	918
LIMITE SUPERIOR	4,23
LIMITE INFERIOR	-
RANGO	4,23
PROMEDIO ACOTADO	2,64
MEDIANA	2,56
DESVIACIÓN ESTANDAR	1,38
INDICADOR RECOMENDADO	1,00
# DE EMPRESAS QUE CUMPLEN	817
	89%

Frecuencia

N°	INTERVALO DE CLASES					
	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	Marca	Frecuencia	F acumulada	% frecuencia
0						
1	0,00	0,38	0,19	41	41	4,47%
2	0,38	0,77	0,58	24	65	7,08%
3	0,77	1,15	0,96	93	158	17,21%
4	1,15	1,54	1,35	105	263	28,65%
5	1,54	1,92	1,73	90	353	38,45%
6	1,92	2,31	2,11	72	425	46,30%
7	2,31	2,69	2,50	61	486	52,94%
8	2,69	3,08	2,88	46	532	57,95%
9	3,08	3,46	3,27	31	563	61,33%
10	3,46	3,84	3,65	31	594	64,71%
11	3,84	4,23	4,04	324	918	100,00%

Análisis gráfico

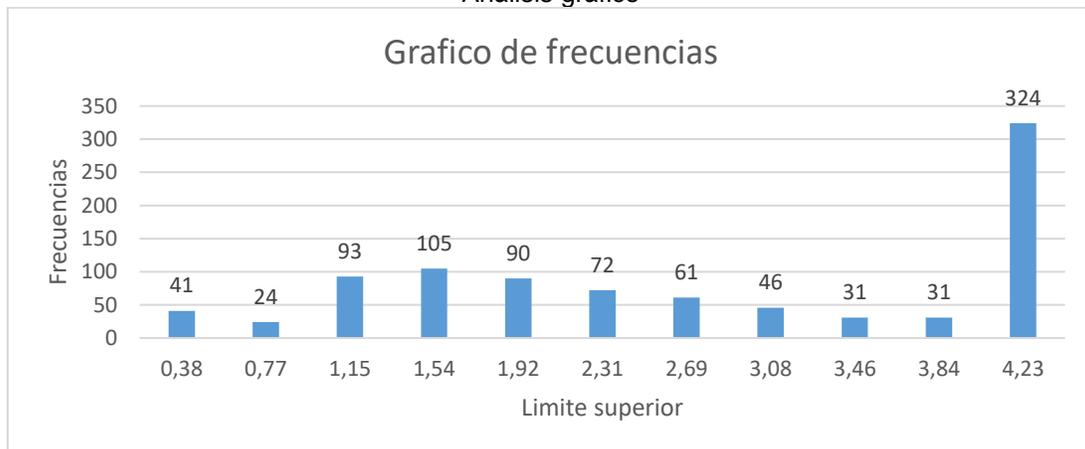



OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**


**ENDEUDAMIENTO**

Mide en qué grado y en qué forma participan los acreedores dentro de la empresa. Se trata de establecer el riesgo que corre la entidad, en el cumplimiento de objeto contractual y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento.

Tamaño de la muestra

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	918
----------------------------	-----

Grafica de dispersión

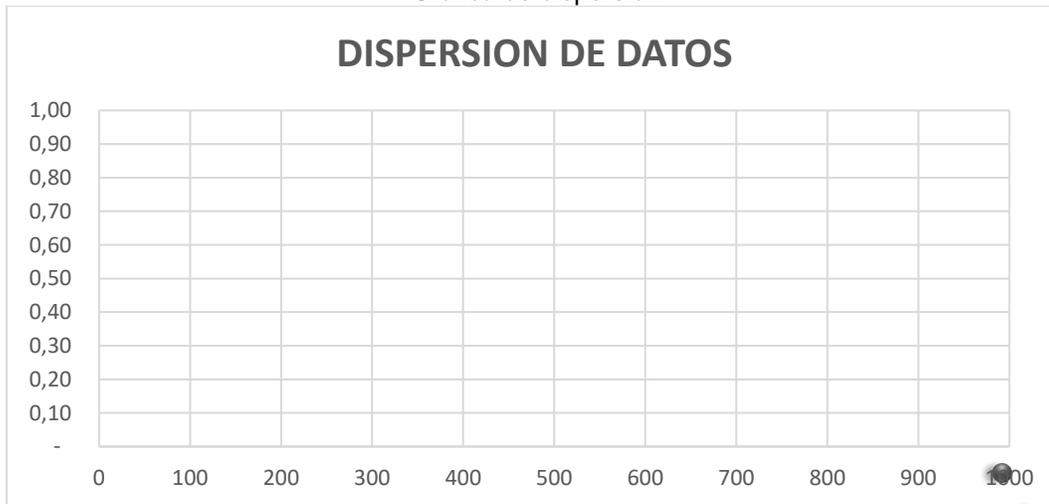

Análisis estadístico

NUMERO DE DATOS	918
LIMITE SUPERIOR	0,60
LIMITE INFERIOR	-
RANGO	0,60
PROMEDIO ACOTADO	0,27
MEDIANA	0,22
DESVIACIÓN ESTANDAR	0,20
INDICADOR RECOMENDADO	0,70
# DE EMPRESAS QUE CUMPLEN	837
	91%


Frecuencia

**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

N°	INTERVALO DE CLASES					
	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	Marca	Frecuencia	F acumulada	% frecuencia
0						
1	0,00	0,05	0,03	143	143	15,58%
2	0,05	0,11	0,08	115	258	28,10%
3	0,11	0,16	0,14	104	362	39,43%
4	0,16	0,22	0,19	99	461	50,22%
5	0,22	0,27	0,25	71	532	57,95%
6	0,27	0,33	0,30	62	594	64,71%
7	0,33	0,38	0,36	60	654	71,24%
8	0,38	0,44	0,41	46	700	76,25%
9	0,44	0,49	0,47	30	730	79,52%
10	0,49	0,55	0,52	36	766	83,44%
11	0,55	0,60	0,58	152	918	100,00%

**Análisis gráfico**

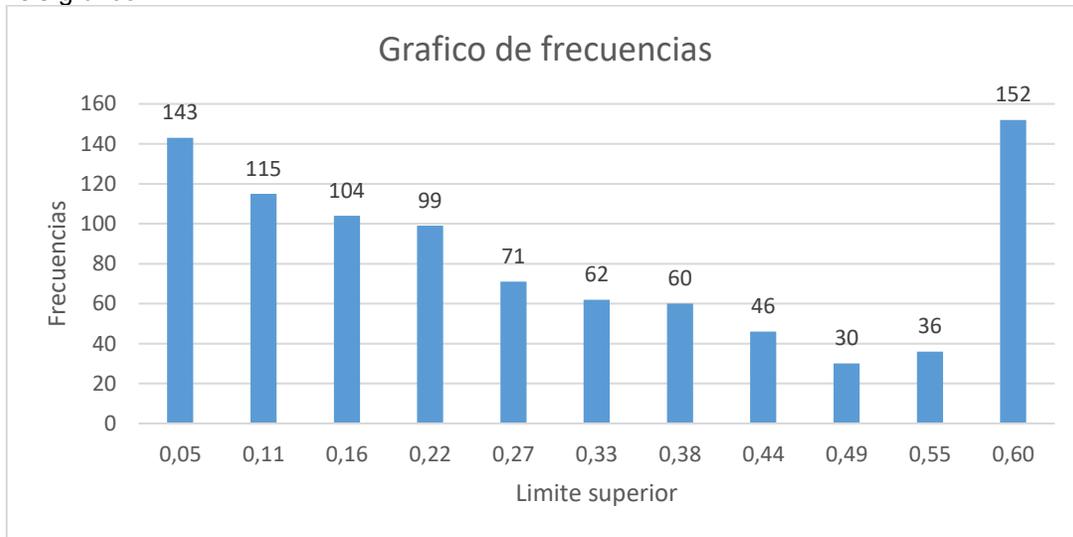

**COBERTURA DE INTERESES**

Establece la relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en relación directa con el nivel de endeudamiento.

Tamaño de la muestra


NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	918
----------------------------	-----

Gráfica de dispersión

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ANÁLISIS DEL SECTOR

DISPERSION DE DATOS

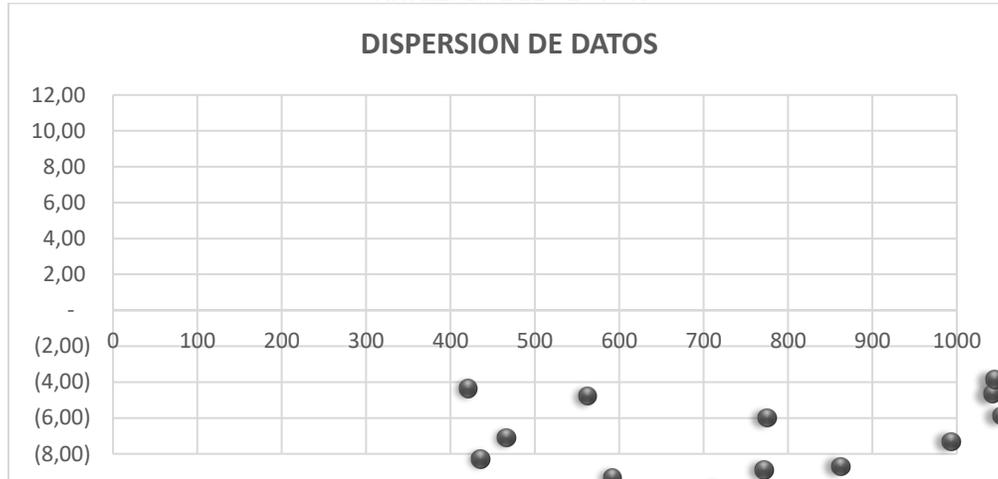

Análisis estadístico

NUMERO DE DATOS	918
LIMITE SUPERIOR	6,54
LIMITE INFERIOR	(6,12)
RANGO	12,66
PROMEDIO ACOTADO	2,91
MEDIANA	1,96
DESVIACIÓN ESTANDAR	3,01
INDICADOR RECOMENDADO	1,00
# DE EMPRESAS QUE CUMPLEN	538
	59%

Frecuencia


N°	INTERVALO DE CLASES		Marca	Frecuencia	F acumulada	% frecuencia
	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR				
0						
1	-6,12	-4,97	-5,55	4	4	0,44%
2	4,97	3,82	-4,39	6	10	1,09%
3	3,82	2,67	-3,24	9	19	2,07%
4	2,67	1,52	-2,09	10	29	3,16%
5	1,52	0,36	-0,94	17	46	5,01%
6	0,36	0,79	0,21	289	335	36,49%
7	0,79	1,94	1,36	83	418	45,53%
8	1,94	3,09	2,51	94	512	55,77%
9	3,09	4,24	3,67	52	564	61,44%
10	4,24	5,39	4,82	38	602	65,58%
11	5,39	6,54	5,97	26	628	68,41%
12	6,54	7,69	7,12	290	918	100,00%

Análisis gráfico



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

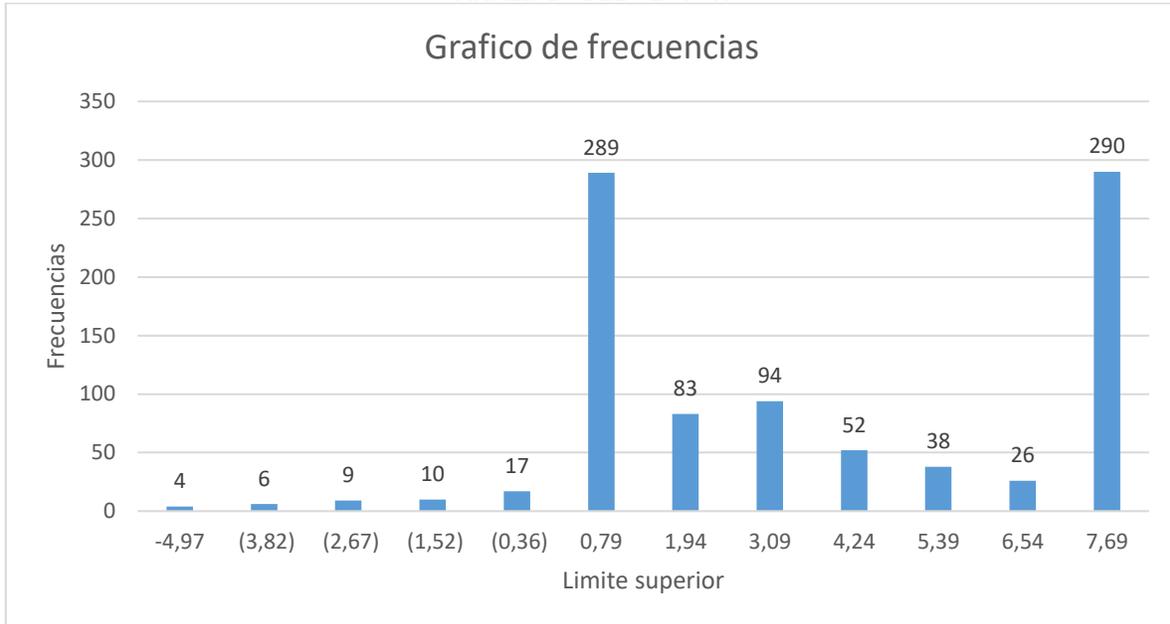

**RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO**


Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Tamaño de la muestra

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	918
----------------------------	-----

**Grafica de dispersión**

**DISPERSION DE DATOS**

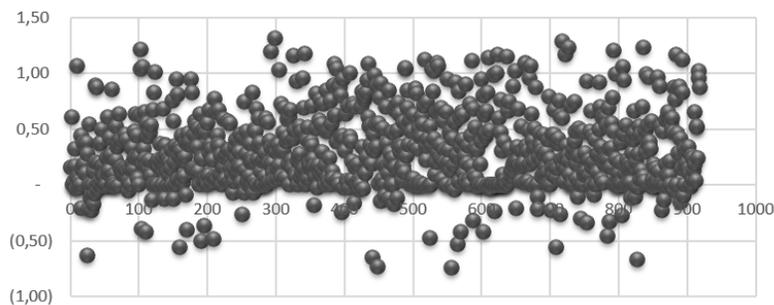

Análisis estadístico

**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**


**ANÁLISIS DEL SECTOR**

NUMERO DE DATOS	918
LIMITE SUPERIOR	0,83
LIMITE INFERIOR	(0,74)
RANGO	1,57
PROMEDIO ACOTADO	0,35
MEDIANA	0,29
DESVIACIÓN ESTANDAR	0,33
INDICADOR RECOMENDADO	-
# DE EMPRESAS QUE CUMPLEN	791
	86%

**Frecuencia**

N°	INTERVALO DE CLASES		Marca	Frecuencia	Facumulada	% frecuencia
	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR				
0						
1	-0,74	-0,60	-0,67	5	5	0,54%
2	0,60	0,45	-0,53	7	12	1,31%
3	0,45	0,31	-0,38	9	21	2,29%
4	0,31	0,17	-0,24	16	37	4,03%
5	0,17	0,03	-0,10	34	71	7,73%
6	0,03	0,12	0,04	164	235	25,60%
7	0,12	0,26	0,19	175	410	44,66%
8	0,26	0,40	0,33	128	538	58,61%
9	0,40	0,54	0,47	103	641	69,83%
10	0,54	0,68	0,61	74	715	77,89%
11	0,68	0,83	0,76	44	759	82,68%
12	0,83	0,97	0,90	159	918	100,00%

**Análisis gráfico**

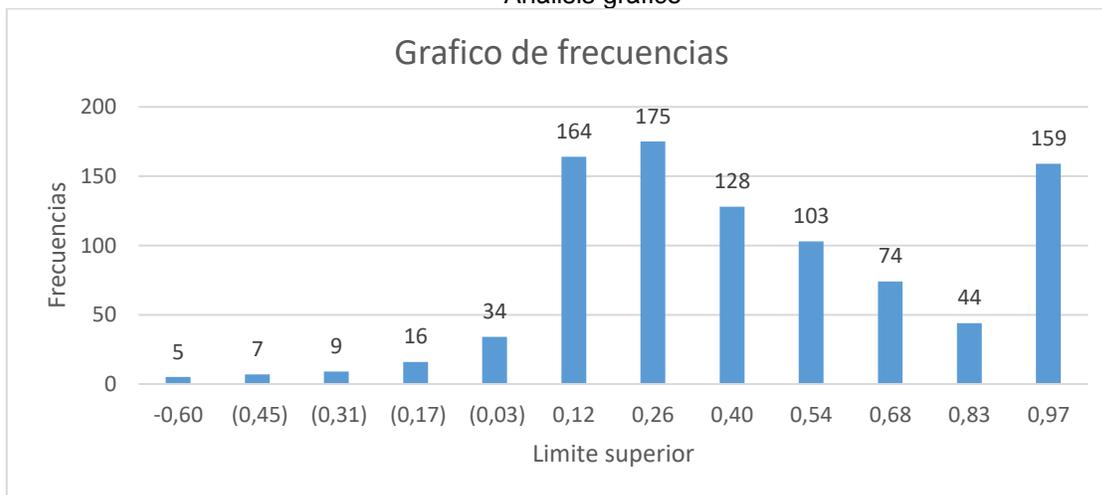

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ANÁLISIS DEL SECTOR**


**RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS**

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Tamaño de la muestra

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	918
----------------------------	-----

Grafica de dispersión  
**DISPERSION DE DATOS**

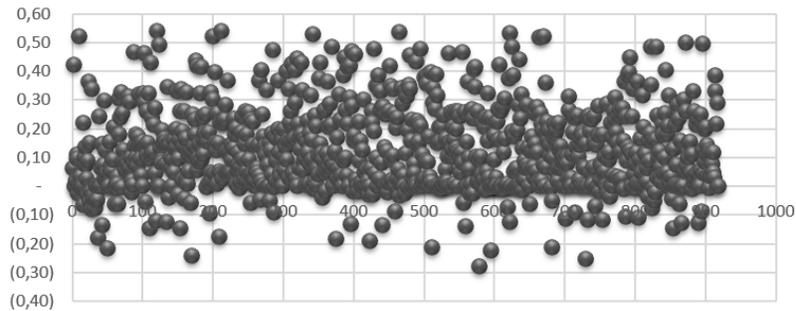

Análisis estadístico

NUMERO DE DATOS	918
LIMITE SUPERIOR	0,25
LIMITE INFERIOR	(0,28)
RANGO	0,53
PROMEDIO ACOTADO	0,12
MEDIANA	0,12
DESVIACIÓN ESTANDAR	0,11
INDICADOR RECOMENDADO	-
# DE EMPRESAS QUE CUMPLEN	771
	84%


Frecuencia

**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

N°	INTERVALO DE CLASES					
	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	Marca	Frecuencia	F acumulada	% frecuencia
0						
1	-0,28	-0,23	-0,25	3	3	0,33%
2	0,23	0,18	-0,20	6	9	0,98%
3	0,18	0,13	-0,16	8	17	1,85%
4	0,13	0,08	-0,11	16	33	3,59%
5	0,08	0,04	-0,06	28	61	6,64%
6	0,04	0,01	-0,01	105	166	18,08%
7	0,01	0,06	0,04	134	300	32,68%
8	0,06	0,11	0,08	117	417	45,42%
9	0,11	0,16	0,13	113	530	57,73%
10	0,16	0,20	0,18	82	612	66,67%
11	0,20	0,25	0,23	77	689	75,05%
12	0,25	0,30	0,28	229	918	100,00%

**Análisis gráfico**

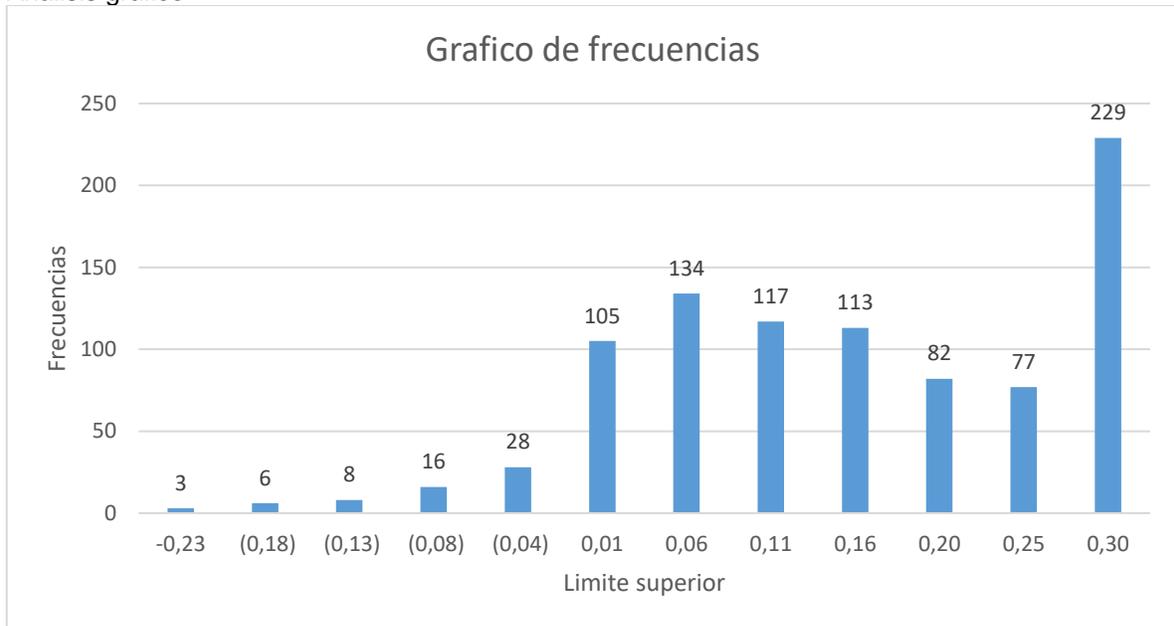

**CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL**



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el concepto de lo que mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un valor máximo para el requisito habilitante. Si el indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo.

Adicionalmente, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación.

Dada la información anterior, y teniendo en cuenta el análisis realizado, se recomiendan los siguientes indicadores financieros y organizacionales para la presente contratación:

**Indicadores de capacidad financiera**

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son:

NOMBRE	FORMULA	ÍNDICE RECOMENDADO
Índice de Liquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	MAYOR O IGUAL A ( $\geq 1$ )
Índice de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	MENOR O IGUAL A ( $\leq 70\%$ )
Razón de Cobertura de Intereses	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos de Intereses}}$	MAYOR O IGUAL A ( $\geq 1$ )

**Indicadores de capacidad organizacional**

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son:

NOMBRE	FORMULA	ÍNDICE RECOMENDADO
Rentabilidad sobre patrimonio	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$	MAYOR O IGUAL A ( $\geq 0\%$ )
Rentabilidad sobre activos	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Activo Total}}$	MAYOR O IGUAL A ( $\geq 0\%$ )



**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

**ANÁLISIS DEL SECTOR**

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Banco de la Republica.- Boletín de indicadores económicos 24 de Mayo de 2021
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2020pr.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Boletín Técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC).
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Boletín Técnico Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) - Cuarto trimestre de 2020.
- <https://camacol.co/>
- <https://www.invias.gov.co/index.php/contratacion2/transparencia-en-la-contratacion>.
- <https://www.ani.gov.co/>
- Superintendencia de Sociedades.
- Procesos Secop I- II.
- Manuales Colombia Compra eficiente.
